



REUNIÓN SOBRE **PTI TÚNEL BINACIONAL AGUA NEGRA**

24 y 25 de Agosto de 2016
Santiago de Chile


PROYECTOS EN RUTA 41 CH. Y ACCESIBILIDAD AL BORDE COSTERO, REGION DE COQUIMBO



**Ministerio de
Obras Públicas**

La Serena, agosto 2016.

ESTUDIOS Y OBRAS EN EJECUCION Y EN PROGRAMA, EN RUTA INTERNACIONAL 41 Ch.

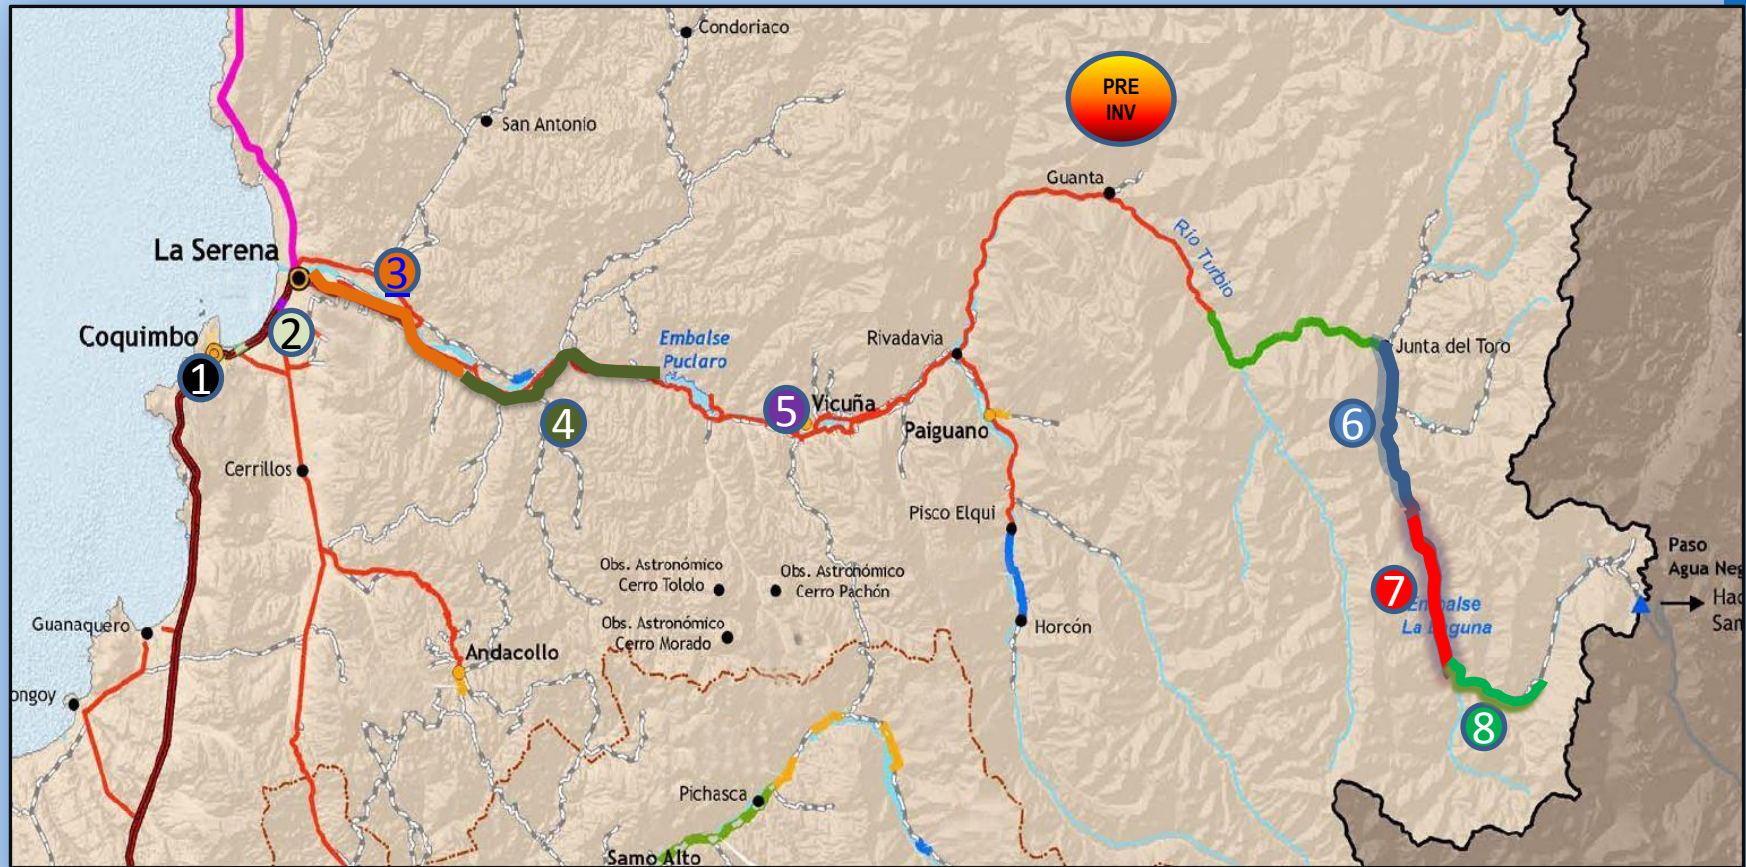

1 = Mejoramiento Acceso al Puerto de Coquimbo desde Ruta 5 norte (Diseño).

2 = Conurbación La Serena – Coquimbo (Diseño)

3 = Ampliación y Reposición Ruta 41 Ch. sector La Serena-Las Rojas ; 17 km; Años 2014-2016 (Diseño).

4 = Ampliación y Reposición Ruta 41 Ch. sector Las Rojas -Bifurcación Marqueza ; 10.7 km; Años 2017-2019 (Diseño).

5 = Construcción Acceso poniente a Vicuña; Años 2016-2018 (Diseño).


6 = Mejoramiento Ruta 41 Ch, S. Juntas del Toro - Puente El Camarón, 15,100 km., 2013-2015 (Obras).

7 = Mejoramiento Ruta 41 Ch, S. Puente El Camarón - La Laguna, 13,755 km., 2014-2017 (Obras).

8 = Mejoramiento Ruta 41 Ch, S. La Laguna - Llano Las Liebres, 20 km., 2014-2016 (Diseño).

Proyecto 1: Mejoramiento Acceso al puerto de Coquimbo desde Ruta 5.

- ***Etapas:*** *Diseño.*
- ***Financiamiento:*** *Gobierno Regional de Coquimbo (FNDR).*
- ***Inversión:*** *M\$ 300.000*
- ***Longitud proyecto:*** *2,5 kilómetros.*
- ***Inicio Legal:*** *En programa.*
- ***Plazo:*** *Por definir.*
- ***Situación actual:*** *Diseño postulado a financiamiento del Gobierno Regional , a la espera de ser priorizado y financiado.*



Proyecto 2: Estudios en la Conurbación La Serena – Coquimbo.

(Coordinadora de Concesiones MOP)

- **Etapas:** *Diseño.*
- **Financiamiento:** *Sectorial.*
- **Inversión ($\Sigma 1+2+3$):** *M\$ 445.130*

(1) Diseño y Expropiaciones / Empresa Dusan Dujisin Quiroz-DDQ.

Monto del estudio: M\$ 181.700

Situación Actual: En Revisión Fase 2 de 3 a nivel de Anteproyecto de Ing.

(2) Demanda y Evaluación Social / CIPRES Ltda.

Monto del estudio, incluye Convenio: M\$ 114.430


Situación Actual: En Revisión Fase 4 de 5 referida a calibración, modelación y micro-simulación del diseño de anteproyecto.



(3) Territorio y Medio Ambiente / Consorcio GS y LEN.

Monto del estudio M\$ 149.000

Situación Actual: Observaciones emitidas Fase 4 de 6, Informe Territorial Final.

Etapas 5 en desarrollo.



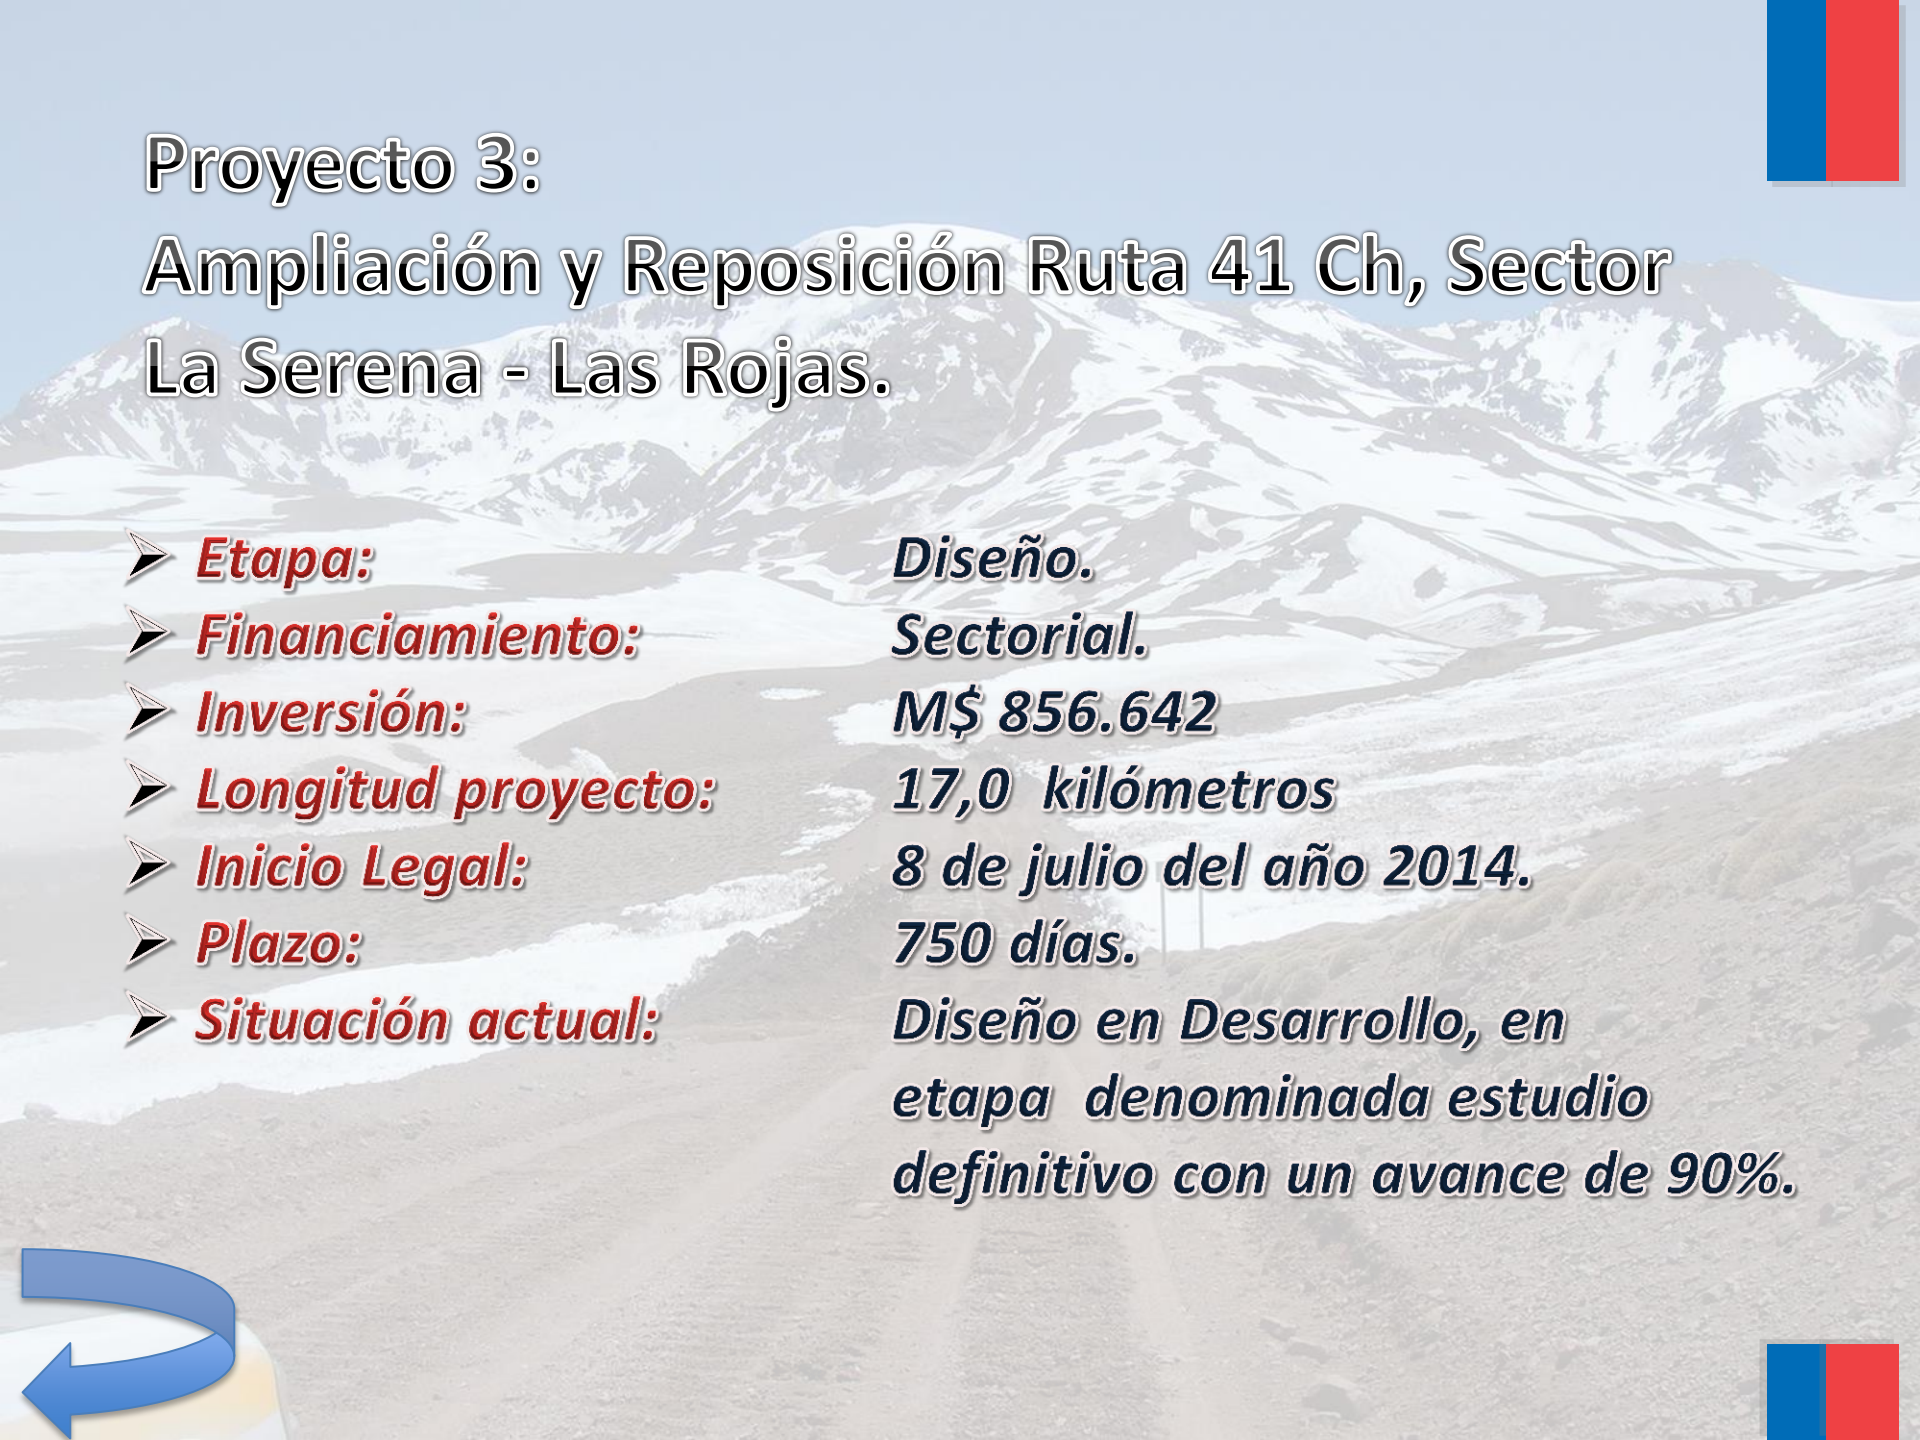

Proyecto 3:

Ampliación y Reposición Ruta 41 Ch, Sector La Serena - Las Rojas.


- ***Etapas:*** *Diseño.*
- ***Financiamiento:*** *Sectorial.*
- ***Inversión:*** *M\$ 856.642*
- ***Longitud proyecto:*** *17,0 kilómetros*
- ***Inicio Legal:*** *8 de julio del año 2014.*
- ***Plazo:*** *750 días.*
- ***Situación actual:*** *Diseño en Desarrollo, en etapa denominada estudio definitivo con un avance de 90%.*



Proyecto 4:


Ampliación y Reposición Ruta 41 Ch, Sector Las Rojas – Bifurcación Marqueza.

- ***Etapas:*** *Diseño.*
- ***Financiamiento:*** *Sectorial.*
- ***Inversión:*** *M\$ 700.000*
- ***Longitud proyecto:*** *10,7 kilometros*
- ***Inicio Legal:*** *En programa 2017*
- ***Plazo:*** *Por definirse.*
- ***Situación actual:*** *Iniciativa incorporada en anteproyecto de ley de presupuesto 2017.*



Proyecto 5: Construcción Acceso Poniente a Vicuña.


- ***Etapas:*** *Diseño.*
- ***Financiamiento:*** *Sectorial.*
- ***Inversión:*** *M\$ 443.300*
- ***Longitud proyecto:*** *Puente mas accesos.*
- ***Inicio Legal:*** *1 de julio del año 2016.*
- ***Plazo:*** *540 días.*
- ***Situación actual:*** *Estudio se encuentra en desarrollo.*



Proyecto 6:

Mejoramiento Ruta 41 Ch, Sector Juntas del Toro – Puente El Camarón.


- ***Etapas:*** ***Obras.***
- ***Financiamiento:*** ***Sectorial.***
- ***Inversión:*** ***M\$ 10.305.955***
- ***Longitud proyecto:*** ***15,1 kilometros***
- ***Inicio Legal:*** ***3 de abril del año 2013.***
- ***Plazo:*** ***840 días.***
- ***Situación actual:*** ***Contrato liquidado anticipadamente, con 60% de avance físico y en proceso de licitación y pronta adjudicación a fines del año 2016.***



Proyecto 7:

Mejoramiento Ruta 41 Ch. sector Puente El Camarón – La Laguna.


- ***Etapas:*** Obras.
- ***Financiamiento:*** Sectorial.
- ***Inversión:*** M\$ 11.415.000
- ***Longitud proyecto:*** 13,76 kilómetros
- ***Inicio Legal:*** 26 de enero del año 2016.
- ***Plazo:*** 720 días.
- ***Situación actual:*** Obras en plena ejecución, con un 5,5% de avance físico.



Proyecto 8:

Mejoramiento Ruta 41 Ch., sector La Laguna –Llano Las Liebres.

- ***Etapas:*** *Diseño.*
- ***Financiamiento:*** *Gobierno Regional Coquimbo (FNDR).*
- ***Inversión:*** *M\$ 432.468*
- ***Longitud proyecto:*** *20,0 kilómetros.*
- ***Inicio Legal:*** *8 de octubre del año 2014.*
- ***Plazo:*** *765 días.*
- ***Situación actual:*** *Diseño en Desarrollo, en etapa denominada estudio definitivo, con un 68% de avance físico.*



Gracias.



Ministerio de
Obras Públicas

Gobierno de Chile
