



# Indicadores de Avance de los Proyectos de la API

Reunión del GTE de los EIDs para la  
Actualización de la Cartera de Proyectos y de la API  
22 – 24 de abril de 2014, Bogotá, Colombia

# OBJETIVO DE LA SESIÓN

- Revisar y analizar los reportes e indicadores que produce el SIP en general y el SMP en particular sobre los proyectos de la API, con el propósito de elaborar informes ejecutivos.

# RESULTADOS ESPERADOS DE LA SESIÓN

- Definir los reportes e indicadores para medir el avance de los proyectos de la API a ser incorporados en el Informe de Avance de la API 2014.
- Considerar el tratamiento de la información actualmente de acceso restringido.

# LOS OBJETIVOS DE LA API

- La Agenda de Proyectos Prioritarios de Integración (API) consiste en un conjunto de **31 proyectos estructurados y 101 proyectos individuales** por un monto de inversión estimado en **US\$16.713,8 millones**, de carácter estratégico y de alto impacto para la integración física y el desarrollo socio-económico regional.
- Su objetivo es **promover la conectividad de la región a partir de la construcción y operación eficiente de la infraestructura**, atendiendo a criterios de desarrollo social y económico sustentable, preservando el ambiente y equilibrio de los ecosistemas.

# LOS OBJETIVOS DEL SMP

- El Sistema de Monitoreo Permanente **es uno de los componentes del SIP**, una de las principales herramientas con las que cuenta el COSIPLAN para cumplir con su misión de implementar la integración de la infraestructura.
- El SMP permite **registrar el avance de los proyectos de la API** desde una perspectiva regional y generar **información oportuna y confiable** para **la toma de decisiones** por parte de las autoridades de gobierno competentes.

# SISTEMA DE INFORMACIÓN DE PROYECTOS DEL COSIPLAN

Base de Datos de la Cartera de Proyectos Del COSIPLAN

Proyectos Individuales API

Base de Datos de los Proyectos Estructurados de la API

Sistema de Monitoreo Permanente

# ANTECEDENTES

- **PAE**
  - ACCION 4.3: Crear y revisar la Agenda de Proyectos Prioritarios de Integración (API) y elaborar un mecanismo de monitoreo permanente.
- **Plan de Trabajo 2013 COSIPLAN-IIRSA**
  - Implementación del SMP a los proyectos API.
- **Plan de Trabajo 2014 COSIPLAN-IIRSA**
  - Identificar indicadores para medir el avance de los proyectos y producir informes ejecutivos.

# INFORMES EJECUTIVOS SOBRE EL AVANCE DE LA API

Los Reportes e Indicadores de la API  
permiten producir:

1. Informes de los proyectos individuales de la API por país
2. Informes por proyecto estructurado
3. Informe de la API en general

# 1. INFORMES DE LOS PROYECTOS INDIVIDUALES DE LA API POR PAÍS

EJEMPLO CON LOS PROYECTOS DE BOLIVIA

# PROYECTOS INDIVIDUALES DE BOLIVIA

## 1- DATOS BÁSICOS

CÓDIGO	NOMBRE DEL PROYECTO	API	PAÍS / PAÍSES	ETAPA DEL PROYECTO	INVERSIÓN ESTIMADA (en US\$)	CANTIDAD DE PROYECTOS EN ESTRUCTURADO
AND47	CENTRO BINACIONAL DE ATENCIÓN DE FRONTERA (CEBAF) DESAGUADERO	7	BOLIVIA, PERU	PRE-EJECUCIÓN	40,231,927	1
CAP10	CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE BINACIONAL SALVADOR MAZZA - YACUIBA Y CENTRO DE FRONTERA	9	ARGENTINA, BOLIVIA	PRE-EJECUCIÓN	45,000,000	9
CAP81	PUENTE Y CENTRO DE FRONTERA LA QUIACA - VILLAZÓN	10	ARGENTINA, BOLIVIA	PERFIL	15,000,000	3
HPP07	MEJORAMIENTO DE LA NAVEGABILIDAD DEL RÍO PARAGUAY ENTRE APA Y CORUMBÁ	17	BOLIVIA, BRASIL, PARAGUAY	PRE-EJECUCIÓN	39,000,000	10
HPP106	SISTEMA DE PREDICCIÓN DE NIVELES EN EL RÍO PARAGUAY (APA - ASUNCIÓN)	17	BOLIVIA, PARAGUAY	PRE-EJECUCIÓN	-	10
HPP122	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CANAL TAMENGO	17	BOLIVIA	PERFIL	10,500,000	10
IOC09	PASO DE FRONTERA INFANTE RIVAROLA - CAÑADA ORURO	23	BOLIVIA, PARAGUAY	EJECUCIÓN	1,900,000	1
IOC25	ÁREA DE CONTROL INTEGRADO PUERTO SUÁREZ - CORUMBÁ	22	BOLIVIA, BRASIL	EJECUCIÓN	2,000,000	4
IOC32	CARRETERA TOLEDO - PISIGA	22	BOLIVIA	EJECUCIÓN	130,500,000	4
IOC78	AEROPUERTO DISTRIBUIDOR DE CARGA Y PASAJEROS PARA SUDAMÉRICA (HUB AEROPUERTO INTERNACIONAL VIRU VIRU, SANTA	21	BOLIVIA	PERFIL	20,000,000	1
IOC80	DOBLE VÍA LA PAZ - SANTA CRUZ	22	BOLIVIA	EJECUCIÓN	269,000,000	4
IOC81	CORREDOR FERROVIARIO BIOCEÁNICO CENTRAL	24	BOLIVIA	PRE-EJECUCIÓN	6,700,000	1
					579,831,927.00	

# PROYECTOS INDIVIDUALES DE BOLIVIA

## 2- PROGRAMACIÓN DEL CICLO DE VIDA DE LOS PROYECTOS INDIVIDUALES

ETAPAS Y SUB-ETAPAS DEL PROYECTO										
PERFIL 0% ②	PRE-EJECUCIÓN 30% ②					EJECUCIÓN 65% ②				CONCLUIDO 5% ②
0% Condición Inicial ②	6% Recursos estudios ②	12% Estudios en desarrollo ②	18% Estudios aprobados ②	24% Permisos otorgados ②	30% Recursos Obras ②	50% Primer cuarto de obra	65% Segundo cuarto de obra	80% Tercer cuarto de obra	95% Cuarto cuarto de obra	100% Obras recibidas
PROGRAMACIÓN, PROGRESO Y DESVÍOS (AND47)										
Término	Término	Término	Término	Término	Término	Término	Término	Término	Término	Término
08/2005	12/2009	12/2009	06/2013	08/2013	10/2013	03/2014	07/2014	11/2014	03/2015	04/2015
PROGRAMACIÓN, PROGRESO Y DESVÍOS (CAP10)										
Término	Término	Término	Término	Término	Término	Término	Término	Término	Término	Término
12/2010	12/2012	12/2013	12/2013	12/2013	12/2013	09/2015	12/2016	06/2017	12/2017	12/2018
PROGRAMACIÓN, PROGRESO Y DESVÍOS (CAP81)										
Término	Término	Término	Término	Término	Término	Término	Término	Término	Término	Término
12/2012	06/2014	12/2014	12/2015	12/2016	12/2016	12/2017	12/2018	12/2019	12/2020	12/2021
PROGRAMACIÓN, PROGRESO Y DESVÍOS (HPP122)										
Término	Término	Término	Término	Término	Término	Término	Término	Término	Término	Término
08/2013	12/2014	12/2015	03/2016	06/2016	03/2017	06/2017	09/2017	12/2017	03/2018	06/2018

# PROYECTOS INDIVIDUALES DE BOLIVIA

## 2- PROGRAMACIÓN DEL CICLO DE VIDA DE LOS PROYECTOS INDIVIDUALES

ETAPAS Y SUB-ETAPAS DEL PROYECTO										
PERFIL 0% ②	PRE-EJECUCIÓN 30% ②					EJECUCIÓN 65% ②				CONCLUIDO 5% ②
0% Condición Inicial ②	6% Recursos estudios ②	12% Estudios en desarrollo ②	18% Estudios aprobados ②	24% Permisos otorgados ②	30% Recursos Obras ②	50% Primer cuarto de obra	65% Segundo cuarto de obra	80% Tercer cuarto de obra	95% Cuarto cuarto de obra	100% Obras recibidas
PROGRAMACIÓN, PROGRESO Y DESVÍOS (IOC9)										
Término	Término	Término	Término	Término	Término	Término	Término	Término	Término	Término
06/2007	01/2009	06/2009	12/2009	01/2010	02/2010	03/2011	03/2012	09/2014	09/2015	12/2015
PROGRAMACIÓN, PROGRESO Y DESVÍOS (IOC25)										
Término	Término	Término	Término	Término	Término	Término	Término	Término	Término	Término
06/2012	06/2012	06/2012	06/2012	12/2012	01/2012	12/2012	06/2014	10/2014	01/2015	06/2015
PROGRAMACIÓN, PROGRESO Y DESVÍOS (IOC32)										
Término	Término	Término	Término	Término	Término	Término	Término	Término	Término	Término
02/2003	06/2003	02/2004	12/2004	02/2006	02/2011	08/2012	02/2013	08/2014	02/2015	12/2015
PROGRAMACIÓN, PROGRESO Y DESVÍOS (IOC78)										
Término	Término	Término	Término	Término	Término	Término	Término	Término	Término	Término
01/2013	12/2013	09/2014	11/2014	11/2014	11/2015	04/2016	09/2016	01/2017	06/2017	12/2017

# PROYECTOS INDIVIDUALES DE BOLIVIA


## 2- PROGRAMACIÓN DEL CICLO DE VIDA DE LOS PROYECTOS INDIVIDUALES

ETAPAS Y SUB-ETAPAS DEL PROYECTO										
PERFIL 0% ②	PRE-EJECUCIÓN 30% ②					EJECUCIÓN 65% ②				CONCLUIDO 5% ②
0% Condición Inicial ②	6% Recursos estudios ②	12% Estudios en desarrollo ②	18% Estudios aprobados ②	24% Permisos otorgados ②	30% Recursos Obras ②	50% Primer cuarto de obra	65% Segundo cuarto de obra	80% Tercer cuarto de obra	95% Cuarto cuarto de obra	100% Obras recibidas
PROGRAMACIÓN, PROGRESO Y DESVÍOS (IOC80)										
Término	Término	Término	Término	Término	Término	Término	Término	Término	Término	Término
02/2010	02/2011	02/2012	05/2012	08/2012	08/2013	02/2014	08/2014	02/2015	08/2015	08/2016
										
PROGRAMACIÓN, PROGRESO Y DESVÍOS (IOC81)										
Término	Término	Término	Término	Término	Término	Término	Término	Término	Término	Término
03/2011	04/2013	08/2013	07/2014	07/2014	07/2015	07/2017	07/2019	07/2021	07/2023	07/2024
										

■ Cumplida   
 ■ Desarrollo normal   
 ■ Desarrollo con inconvenientes   
 ■ No cumplida

# PROYECTOS INDIVIDUALES DE BOLIVIA

## 3- EVOLUCIÓN DE LOS PROYECTOS INDIVIDUALES ESTIMACIÓN DE CONCLUSIÓN

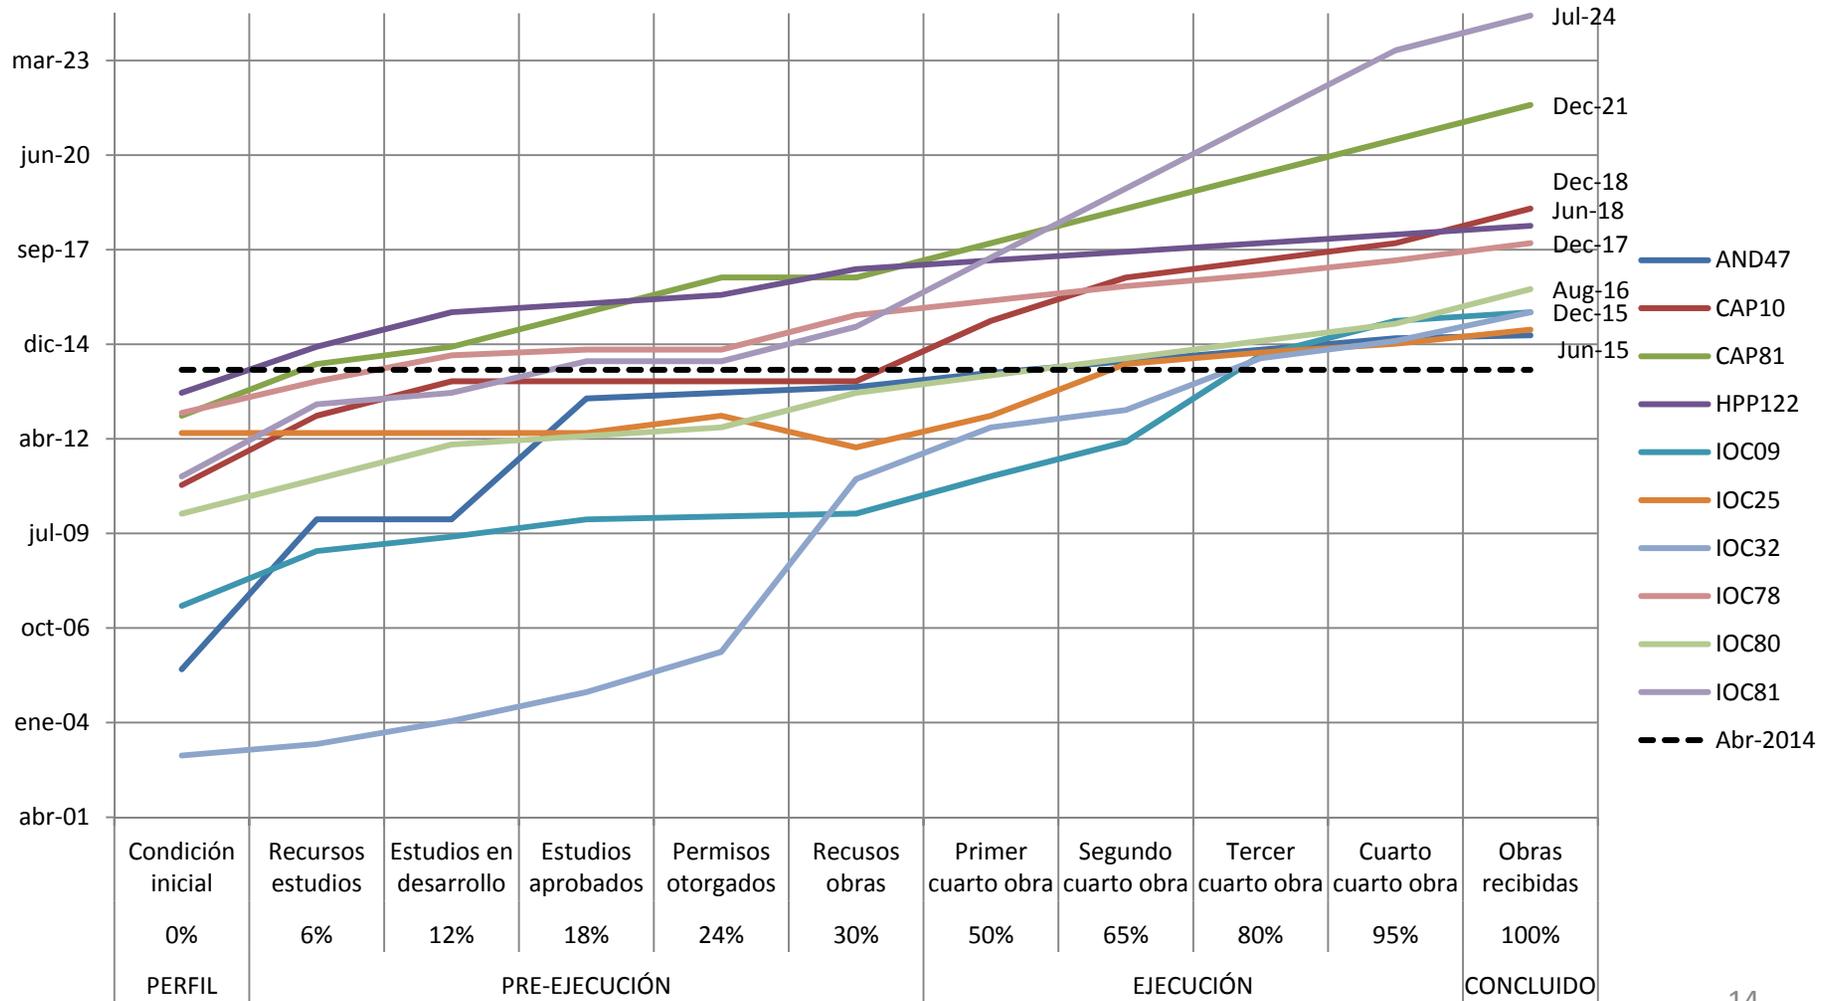

# PROYECTOS INDIVIDUALES DE BOLIVIA

## 4- DESVÍOS EN EL AVANCE DEL CICLO DE VIDA

Tipo de Desvío	Fecha de Término de la Subetapa	Subetapa	Causa	Fecha de Alta del Desvío	Fecha Modificación	Descripción	Estado
	03/2014	Primer cuarto de obra	Problemas del trabajo por causas institucionales	31/03/2014		La primera licitación fue declarada desierta. En el mes de abril de 2014 se convocará la segunda licitación. Altera todo el cronograma restante	En curso
	04/2014	Segundo cuarto de obra	Cambio de período	11/09/2013		Desvío automático por cambio de período	En curso
	06/2014	Tercer cuarto de obra	Cambio de período	11/09/2013		Desvío automático por cambio de período	En curso
	08/2014	Cuarto cuarto de obra	Cambio de período	11/09/2013		Desvío automático por cambio de período	En curso

Posibles causas de desvíos:

- Problemas por causas institucionales (dimensión alcance)
- Problemas por causas fuera del control del proyecto (dimensión alcance)
- Atraso en el desembolso de fondos (dimensión costo y financiamiento)
- Aumento de costos (dimensión costo y financiamiento)
- Desvío automático por cambio de fecha (dimensión plazos)

## 2. INFORMES POR PROYECTO ESTRUCTURADO DE LA API

EJEMPLO CON EL PROYECTO  
“MEJORAMIENTO EN LA CONECTIVIDAD VIAL EN EL  
EJE INTEROCEÁNICO CENTRAL”

# MEJORAMIENTO EN LA CONECTIVIDAD VIAL EN EL EJE INTEROCEÁNICO CENTRAL

## 1- DATOS BÁSICOS

CÓDIGO API: **22**

EJE: **INTEROCEÁNICO CENTRAL**

PAÍSES: **BOLIVIA - BRASIL**

TIPO DE PROYECTO: **Transporte Carretero**

INVERSIÓN ESTIMADA: **US\$ 431,5 millones**

TIPO DE FINANCIAMIENTO: **Público**

CODIGO BD	NOMBRE DE LOS PROYECTOS INDIVIDUALES	PAISES DEL PROYECTO	ETAPA DEL PROYECTO	MONTO US\$
<b>IOC14</b>	CIRCUNVALACIÓN VIAL DE CAMPO GRANDE	BR	EJECUCIÓN	30.000.000
<b>IOC25</b>	AREA DE CONTROL INTEGRADO PUERTO SUÁREZ - CORUMBÁ	BR - BO	EJECUCIÓN	2.000.000
<b>IOC32</b>	CARRETERA TOLEDO - PISIGA	BO	EJECUCIÓN	130.500.000
<b>IOC80</b>	DOBLE VÍA LA PAZ - SANTA CRUZ	BO	EJECUCIÓN	269.000.000


# MEJORAMIENTO EN LA CONECTIVIDAD VIAL EN EL EJE INTEROCEÁNICO CENTRAL

## 2- PROGRAMACIÓN DEL CICLO DE VIDA DE LOS PROYECTOS INDIVIDUALES

ETAPAS Y SUB-ETAPAS DEL PROYECTO										
PERFIL 0% 🕒	PRE-EJECUCIÓN 30% 🕒					EJECUCIÓN 65% 🕒				CONCLUIDO 5% 🕒
0% Condición Inicial 🕒	6% Recursos estudios 🕒	12% Estudios en desarrollo 🕒	18% Estudios aprobados 🕒	24% Permisos otorgados 🕒	30% Recursos Obras 🕒	50% Primer cuarto de obra	65% Segundo cuarto de obra	80% Tercer cuarto de obra	95% Cuarto cuarto de obra	100% Obras recibidas
PROGRAMACIÓN, PROGRESO Y DESVÍOS (OC14)										
Término	Término	Término	Término	Término	Término	Término	Término	Término	Término	Término
04/2011	04/2011	04/2011	04/2011	04/2011	04/2011	04/2011	04/2012	06/2013	06/2014	07/2014
PROGRAMACIÓN, PROGRESO Y DESVÍOS (OC25)										
Término	Término	Término	Término	Término	Término	Término	Término	Término	Término	Término
06/2012	06/2012	06/2012	06/2012	12/2012	01/2012	12/2012	06/2014	10/2014	01/2015	06/2015
PROGRAMACIÓN, PROGRESO Y DESVÍOS (OC32)										
Término	Término	Término	Término	Término	Término	Término	Término	Término	Término	Término
02/2003	06/2003	02/2004	12/2004	02/2006	02/2011	08/2012	02/2013	08/2014	02/2015	12/2015
PROGRAMACIÓN, PROGRESO Y DESVÍOS (OC80)										
Término	Término	Término	Término	Término	Término	Término	Término	Término	Término	Término
02/2010	02/2011	02/2012	05/2012	08/2012	08/2013	02/2014	08/2014	02/2015	08/2015	08/2016

# MEJORAMIENTO EN LA CONECTIVIDAD VIAL EN EL EJE INTEROCEÁNICO CENTRAL


## 3- EVOLUCIÓN DE LOS PROYECTOS INDIVIDUALES ESTIMACIÓN DE CONCLUSIÓN DEL PROYECTO ESTRUCTURADO (AGOSTO 2016)

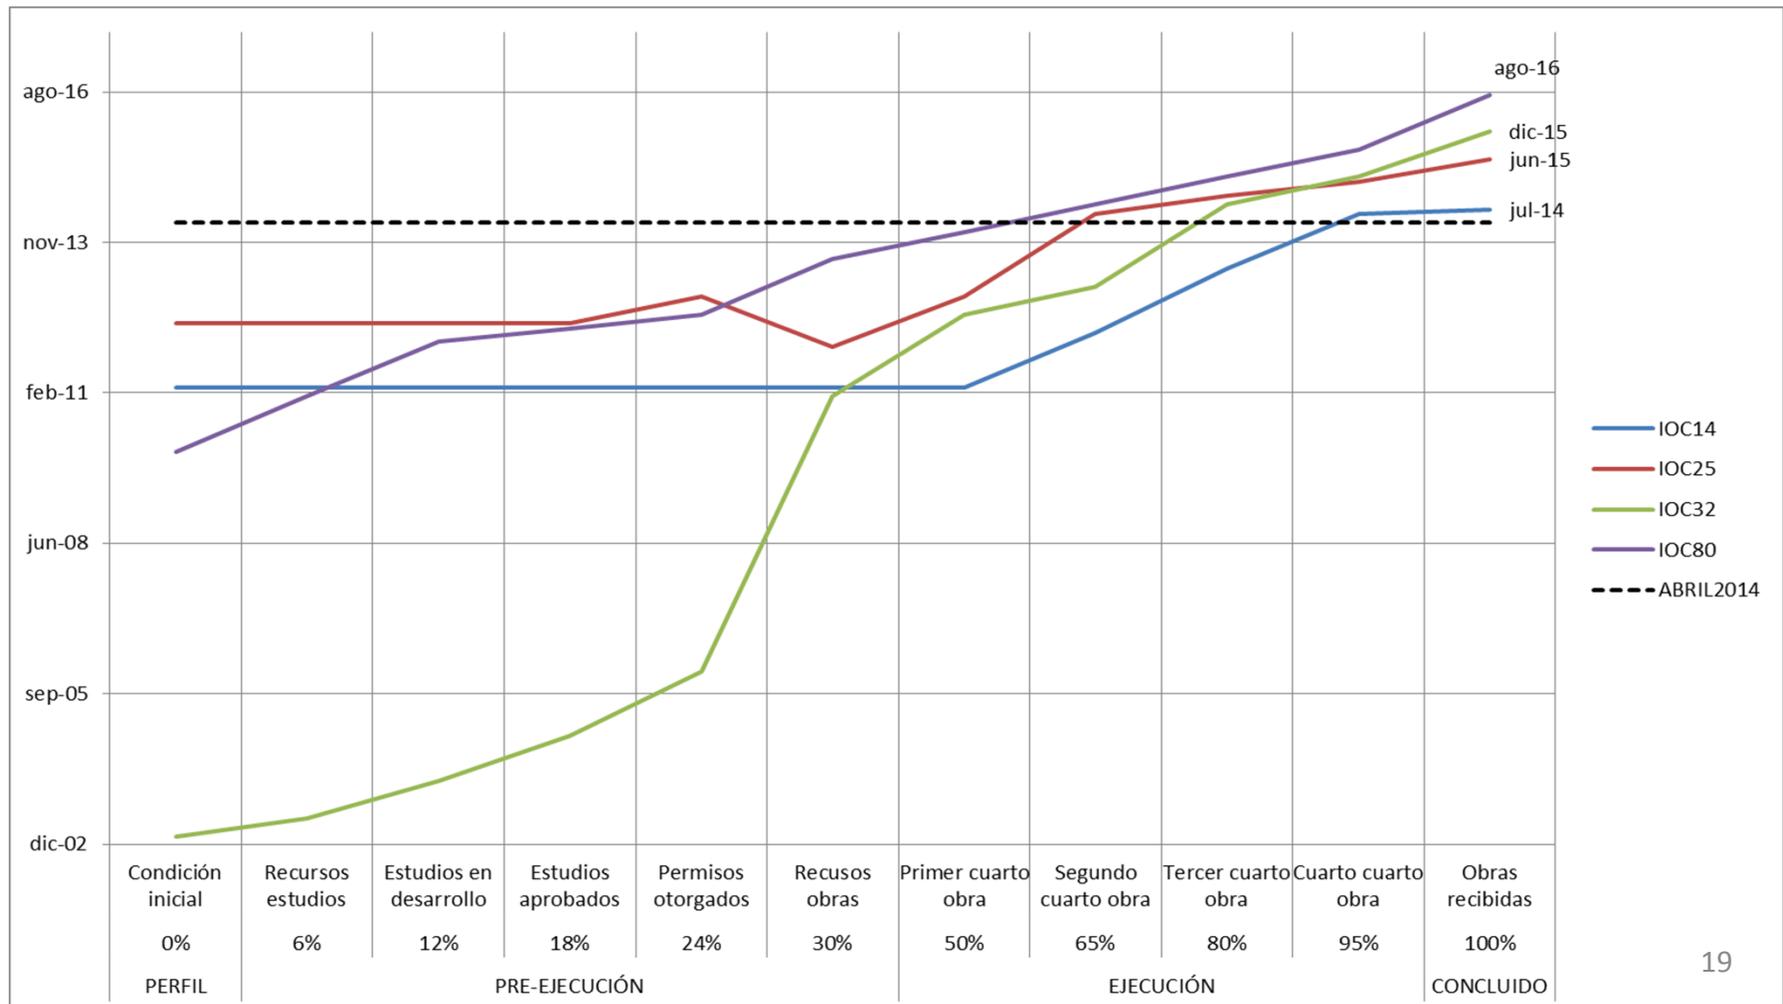

# MEJORAMIENTO EN LA CONECTIVIDAD VIAL EN EL EJE INTEROCEÁNICO CENTRAL


## 4- MONITOREO DEL PROGRESO DEL PROYECTO ESTRUCTURADO

Indicadores de Etapa actual y Avance en el último período (6 meses)

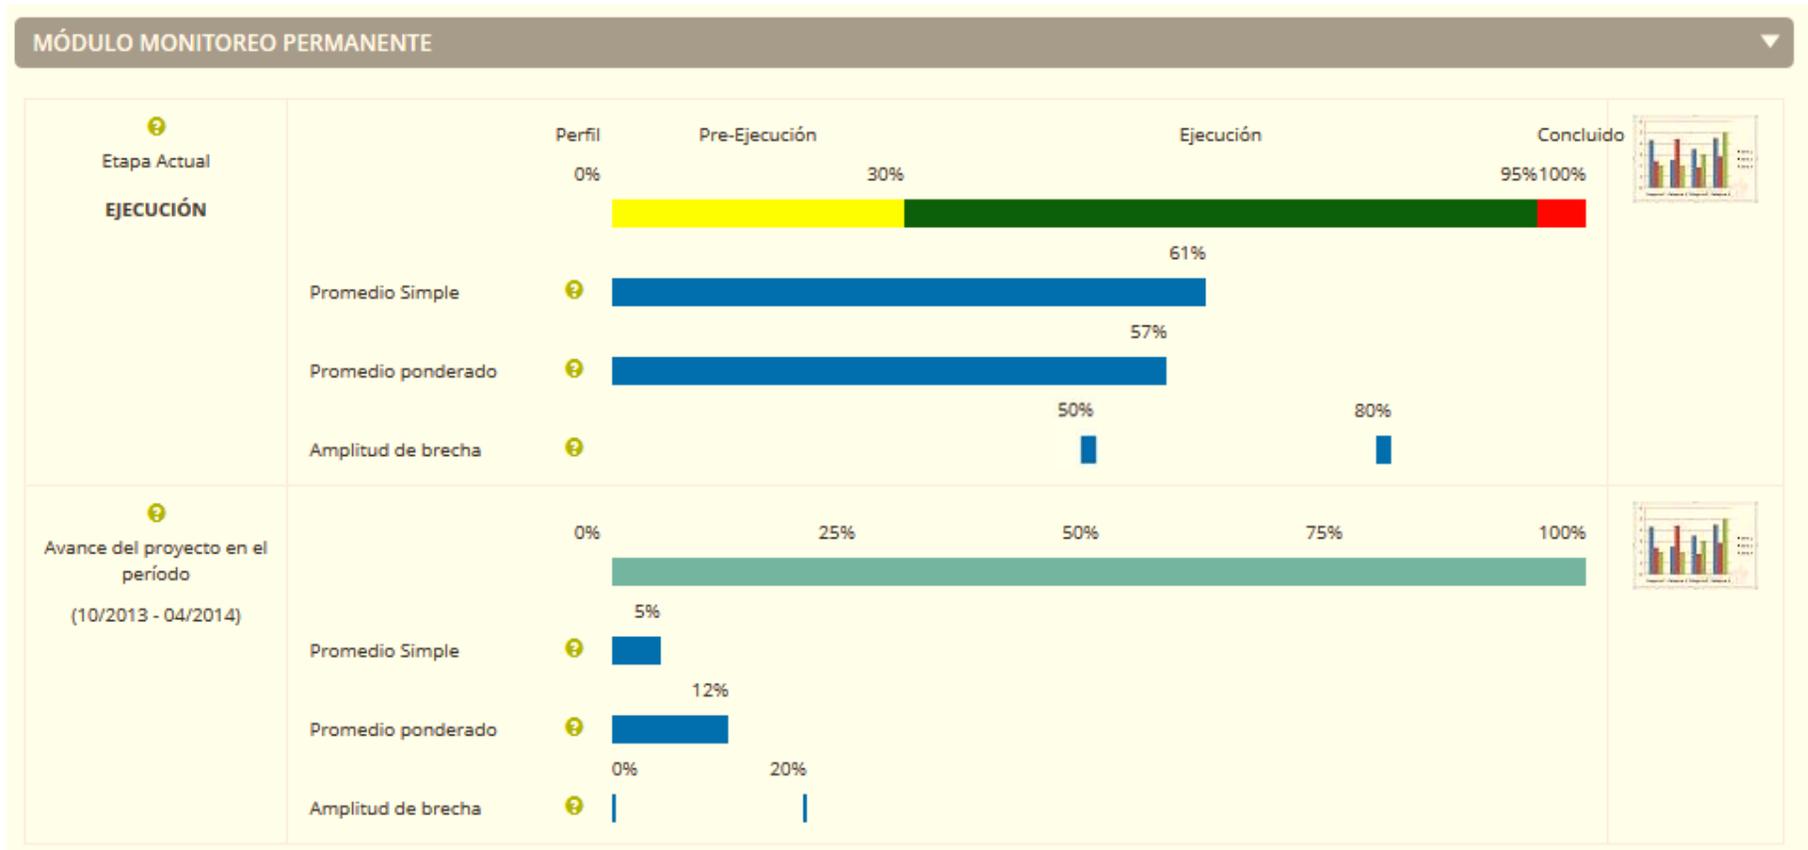

# MEJORAMIENTO EN LA CONECTIVIDAD VIAL EN EL EJE INTEROCEÁNICO CENTRAL

## 5- INDICADOR DE ETAPA ACTUAL (GRÁFICO)

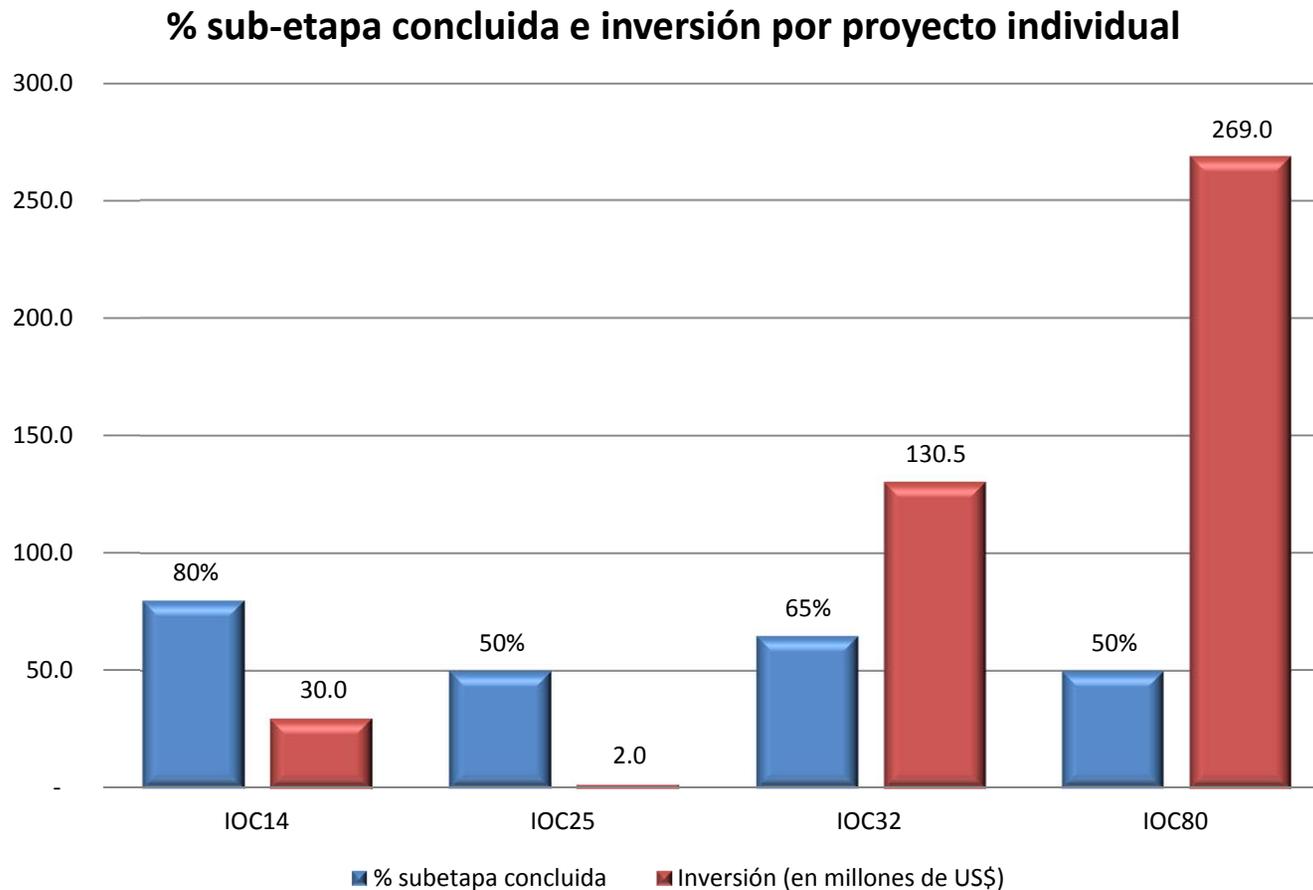


EL GRÁFICO MUESTRA EL PORCENTAJE DE AVANCE DE CADA PROYECTO INDIVIDUAL Y EL MONTO DE INVERSIÓN ESTIMADO

# MEJORAMIENTO EN LA CONECTIVIDAD VIAL EN EL EJE INTEROCEÁNICO CENTRAL

## 6- INDICADOR DE AVANCE EN EL ÚLTIMO PERÍODO (6 MESES) (GRÁFICO)


Avances (en%) e inversión (en millones de US\$) por proyecto individual

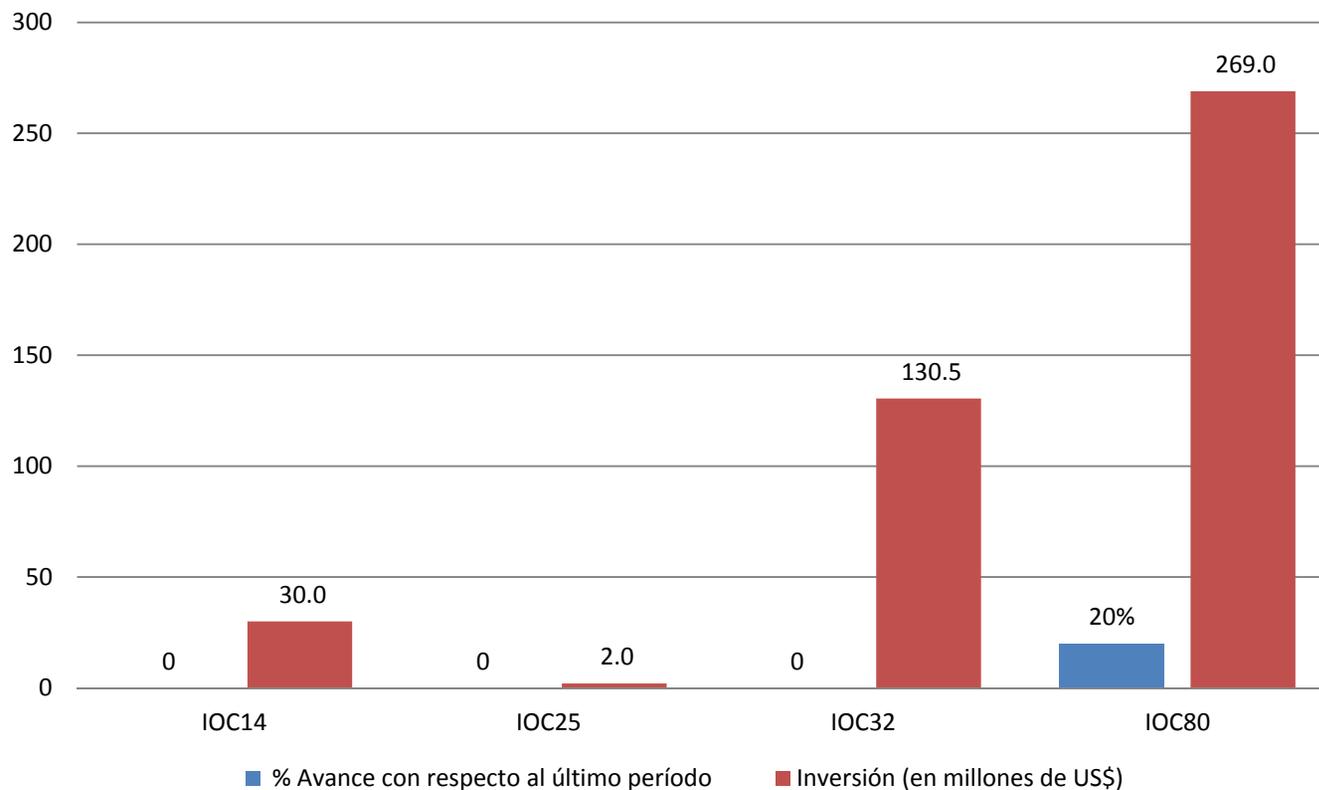

EL GRÁFICO MUESTRA EL PORCENTAJE DE AVANCE EN EL ÚLTIMO PERÍODO DE CADA PROYECTO INDIVIDUAL Y EL MONTO DE INVERSIÓN ESTIMADO

# MEJORAMIENTO EN LA CONECTIVIDAD VIAL EN EL EJE INTEROCEÁNICO CENTRAL

## 7- RELACIÓN ENTRE ETAPA ACTUAL Y AVANCE EN EL ÚLTIMO PERIODO

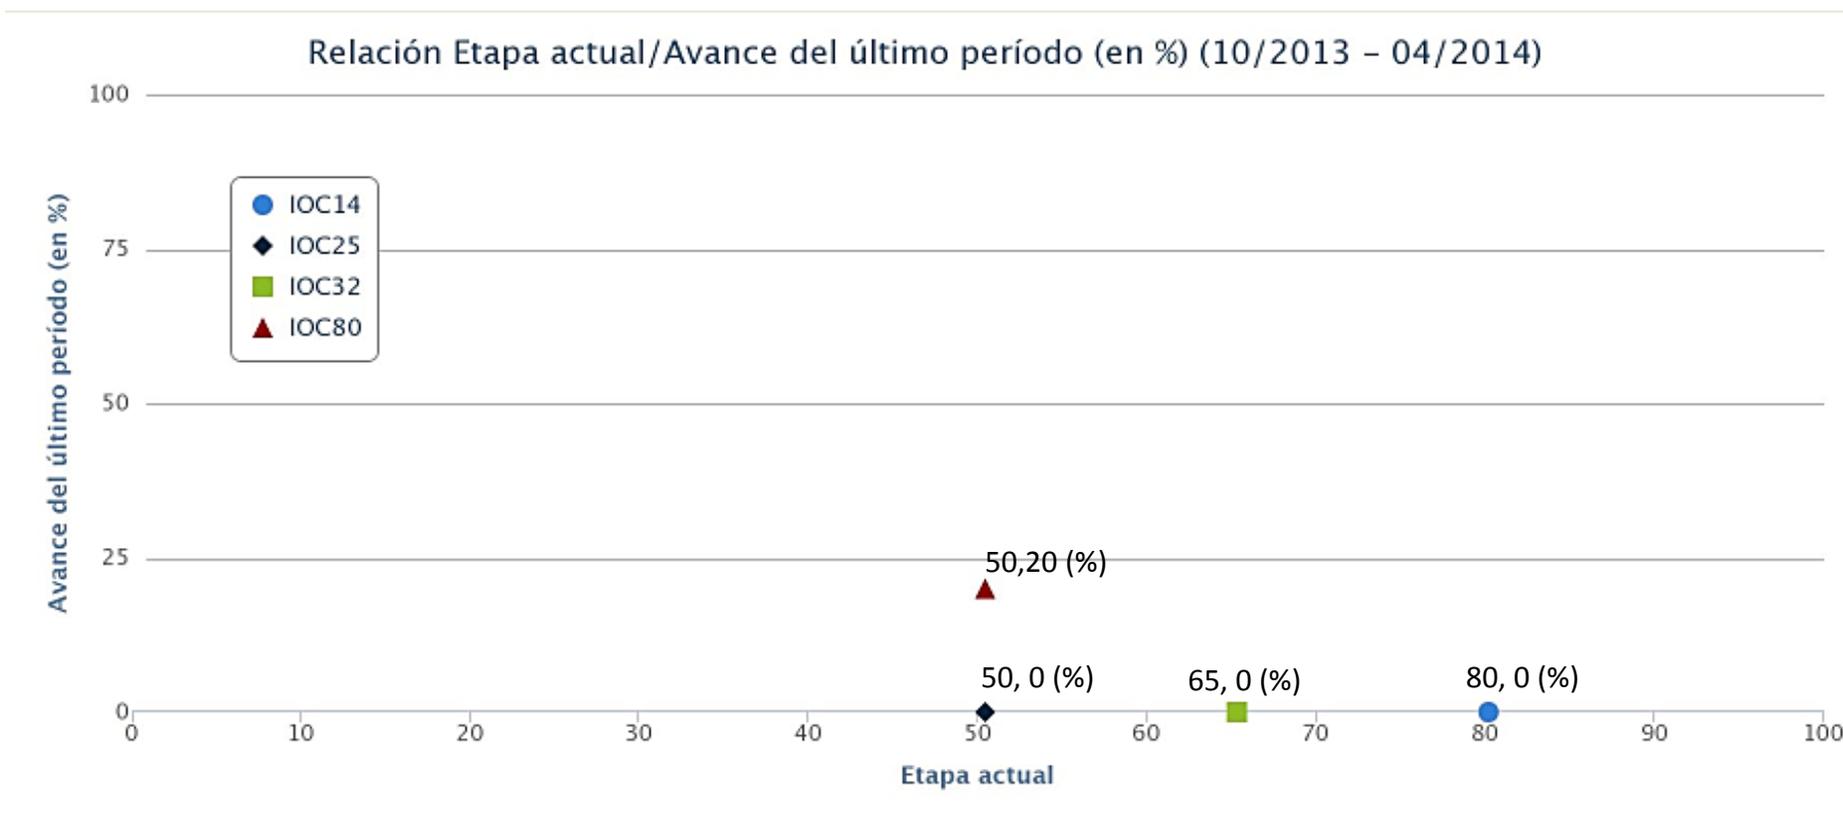

ESTE GRÁFICO PERMITE COMPARAR LOS PROYECTOS INDIVIDUALES EN FUNCIÓN DE SU ESTADO DE AVANCE ACTUAL Y EL ALCANZADO EN EL ÚLTIMO PERIODO

# MEJORAMIENTO EN LA CONECTIVIDAD VIAL EN EL EJE INTEROCEÁNICO CENTRAL

## 8- DESVÍOS EN EL AVANCE DEL CICLO DE VIDA

Tipo de Desvío	Fecha de Término de la Subetapa	Subetapa	Causa	Fecha de Alta del Desvío	Fecha Modificación	Descripción	Estado
	04/2014	Recursos Obras	Cambio de período	31/03/2014		Desvío automático por cambio de período	En curso
	06/2014	Condición Inicial	Problemas del trabajo por causas institucionales	24/09/2013		No esté definido aún la entidad estatal competente para dirigir el proyecto, así como el marco normativo para lograr su desarrollo; los cuáles se estiman definirlos en el 1er. Semestre del 2014.	En curso

Posibles causas de desvíos:

- Problemas por causas institucionales (dimensión alcance)
- Problemas por causas fuera del control del proyecto (dimensión alcance)
- Atraso en el desembolso de fondos (dimensión costo y financiamiento)
- Aumento de costos (dimensión costo y financiamiento)
- Desvío automático por cambio de fecha (dimensión plazos)


Nota: Este desvío se presenta a modo de ejemplo y no corresponde a ningún individual del proyecto API 22

## 3. INFORME DE LA API EN GENERAL


EJEMPLO CON INFORMACIÓN A OCTUBRE '13  
*INFORME DE AVANCE DE LA API 2013*

# INFORME DE AVANCE DE LA API 2013

1- AVANCE DE LA API 2012-2013 EN NÚMERO DE PROYECTOS ESTRUCTURADOS E INDIVIDUALES

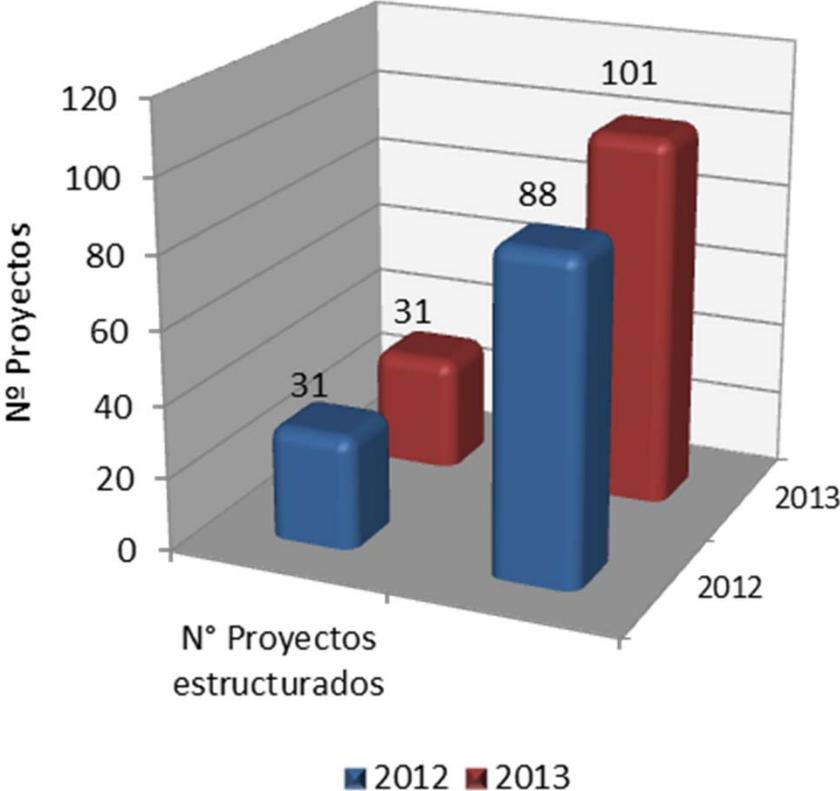


2- AVANCE DE LA API 2012-2013 EN INVERSIÓN ESTIMADA EN MILLONES DE US\$

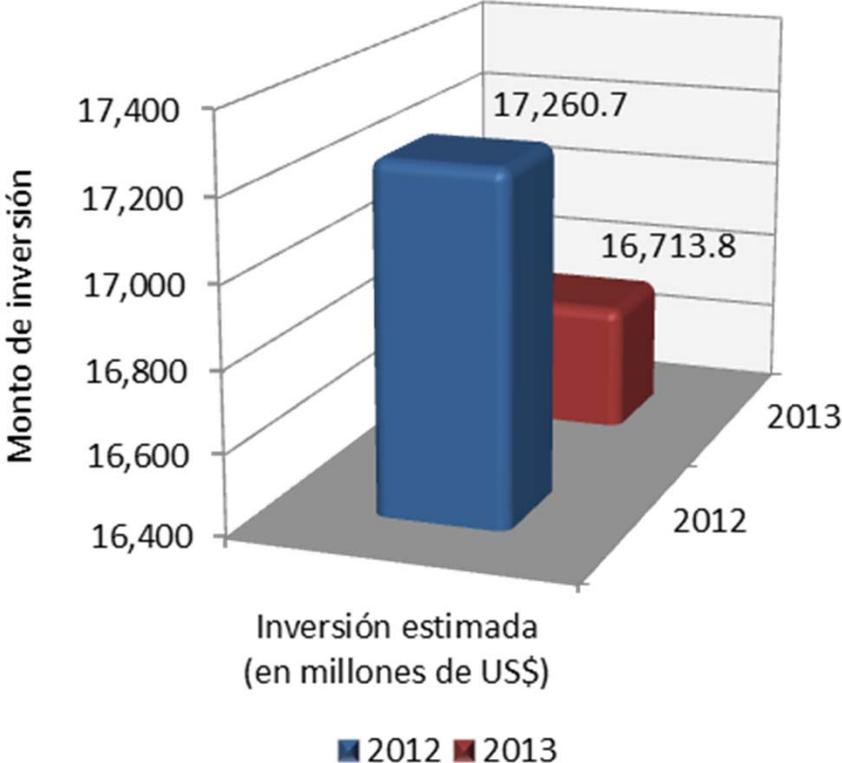



# INFORME DE AVANCE DE LA API 2013

## 3- AVANCE DE LA API 2012-2013 SEGÚN EL CICLO DE VIDA DE LOS PROYECTOS

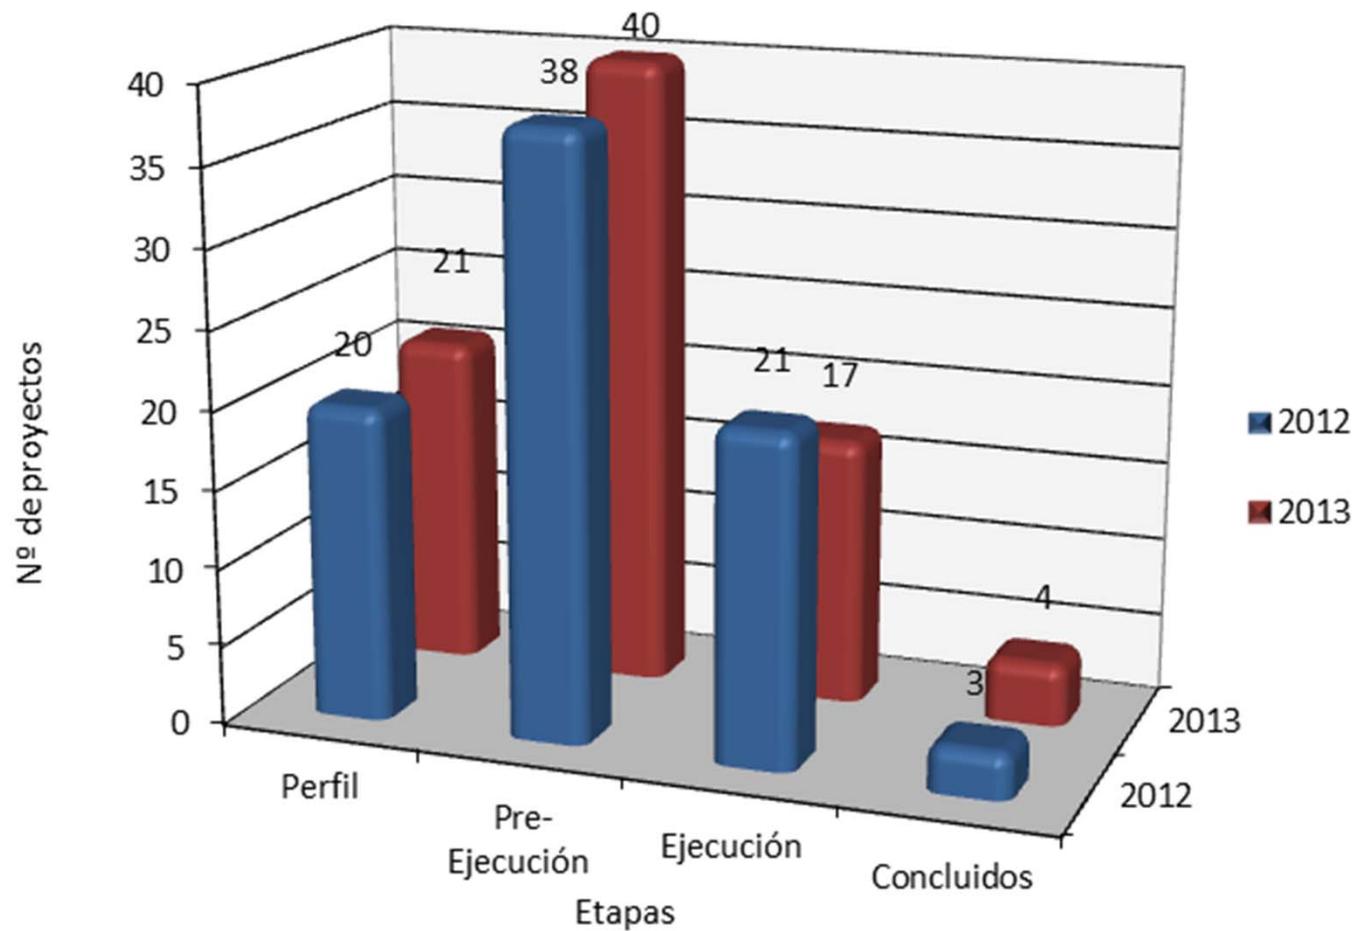

# INFORME DE AVANCE DE LA API 2013


## 4- CANTIDAD DE PROYECTOS E INVERSIÓN SEGÚN ETAPA DEL CICLO DE VIDA

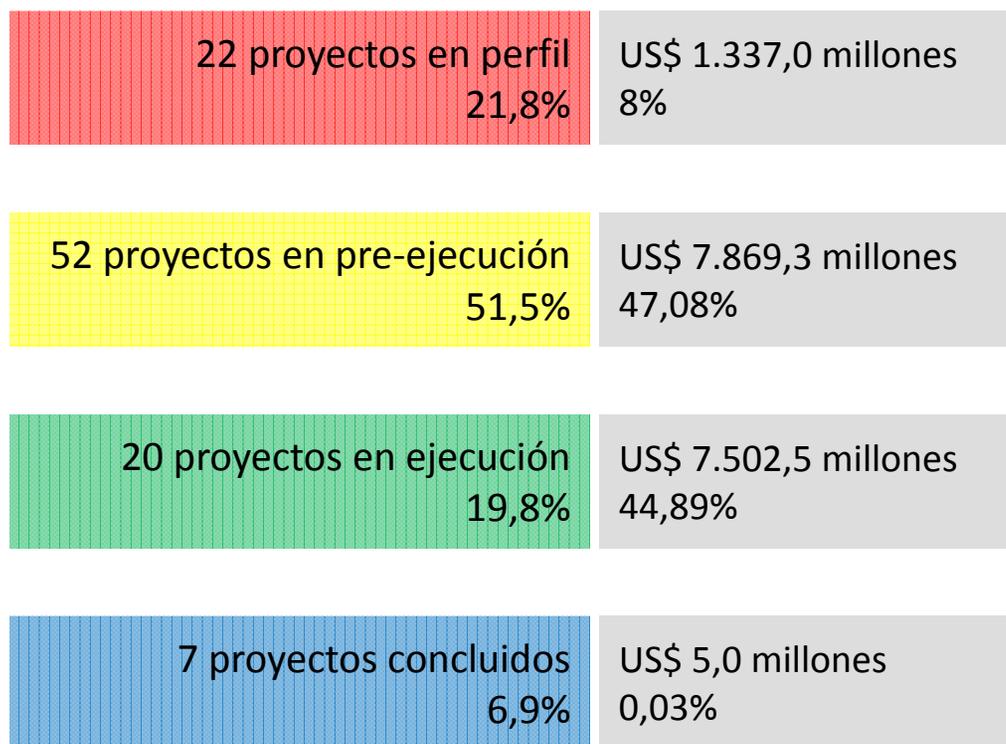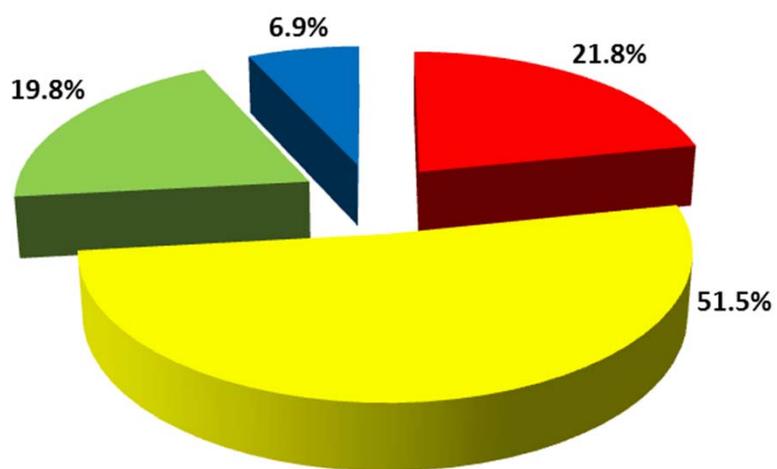

Fuente: Sistema de Información del COSIPLAN al 4/10/2013


# INFORME DE AVANCE DE LA API 2013

## 5- PROYECTOS POR EID Y ETAPA DEL CICLO DE VIDA (en número de proyectos)

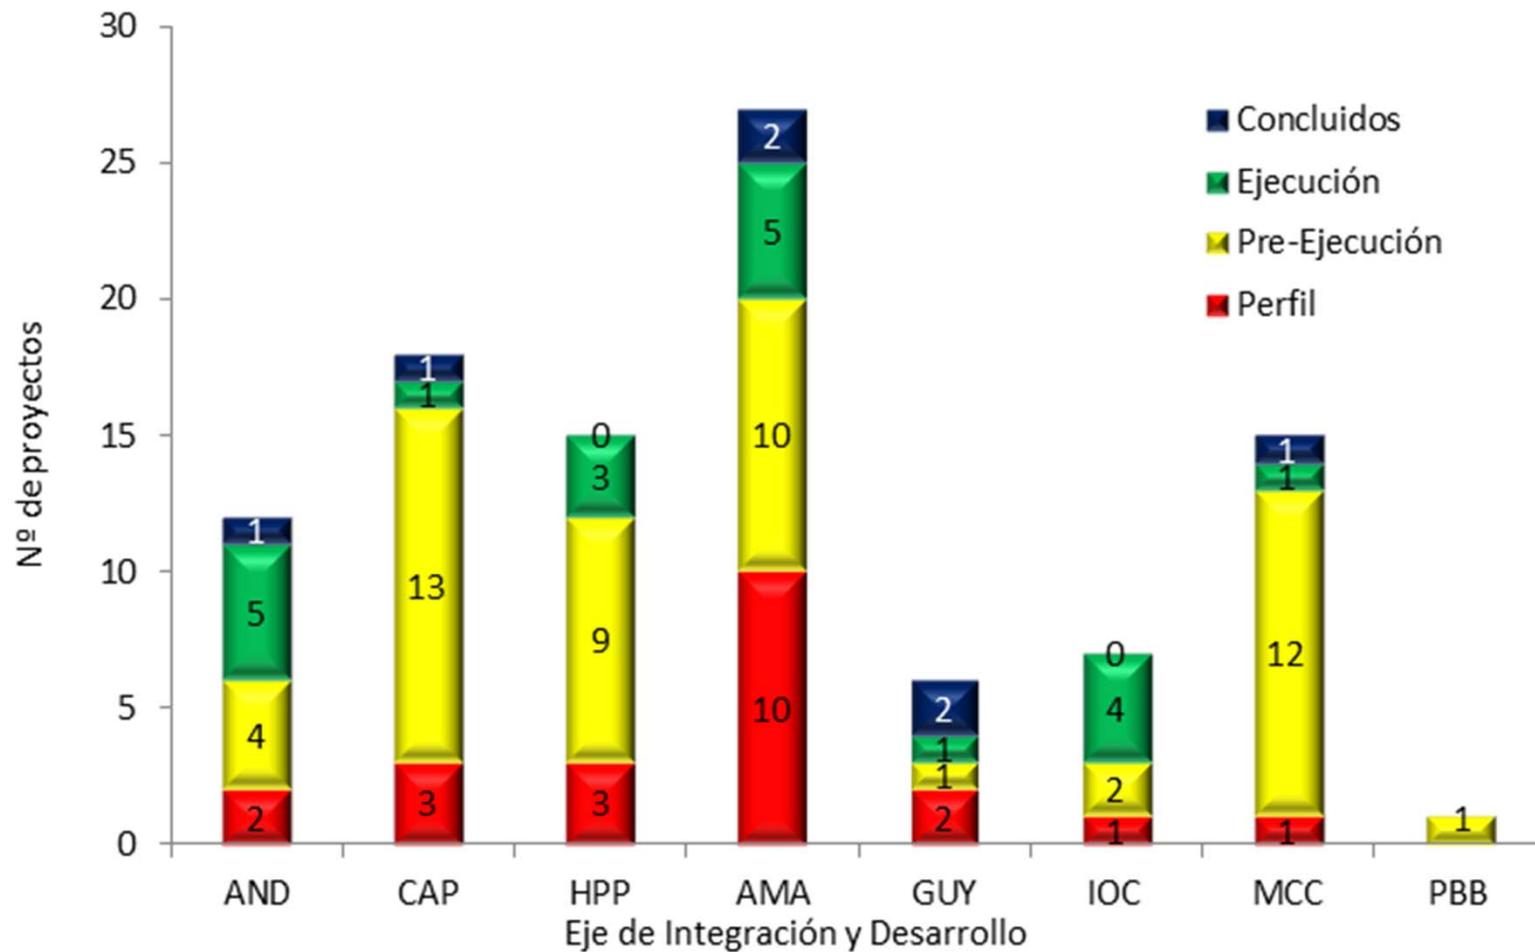

# INFORME DE AVANCE DE LA API 2013

## 5- PROYECTOS POR PAIS Y ETAPA DEL CICLO DE VIDA (en número de proyectos)

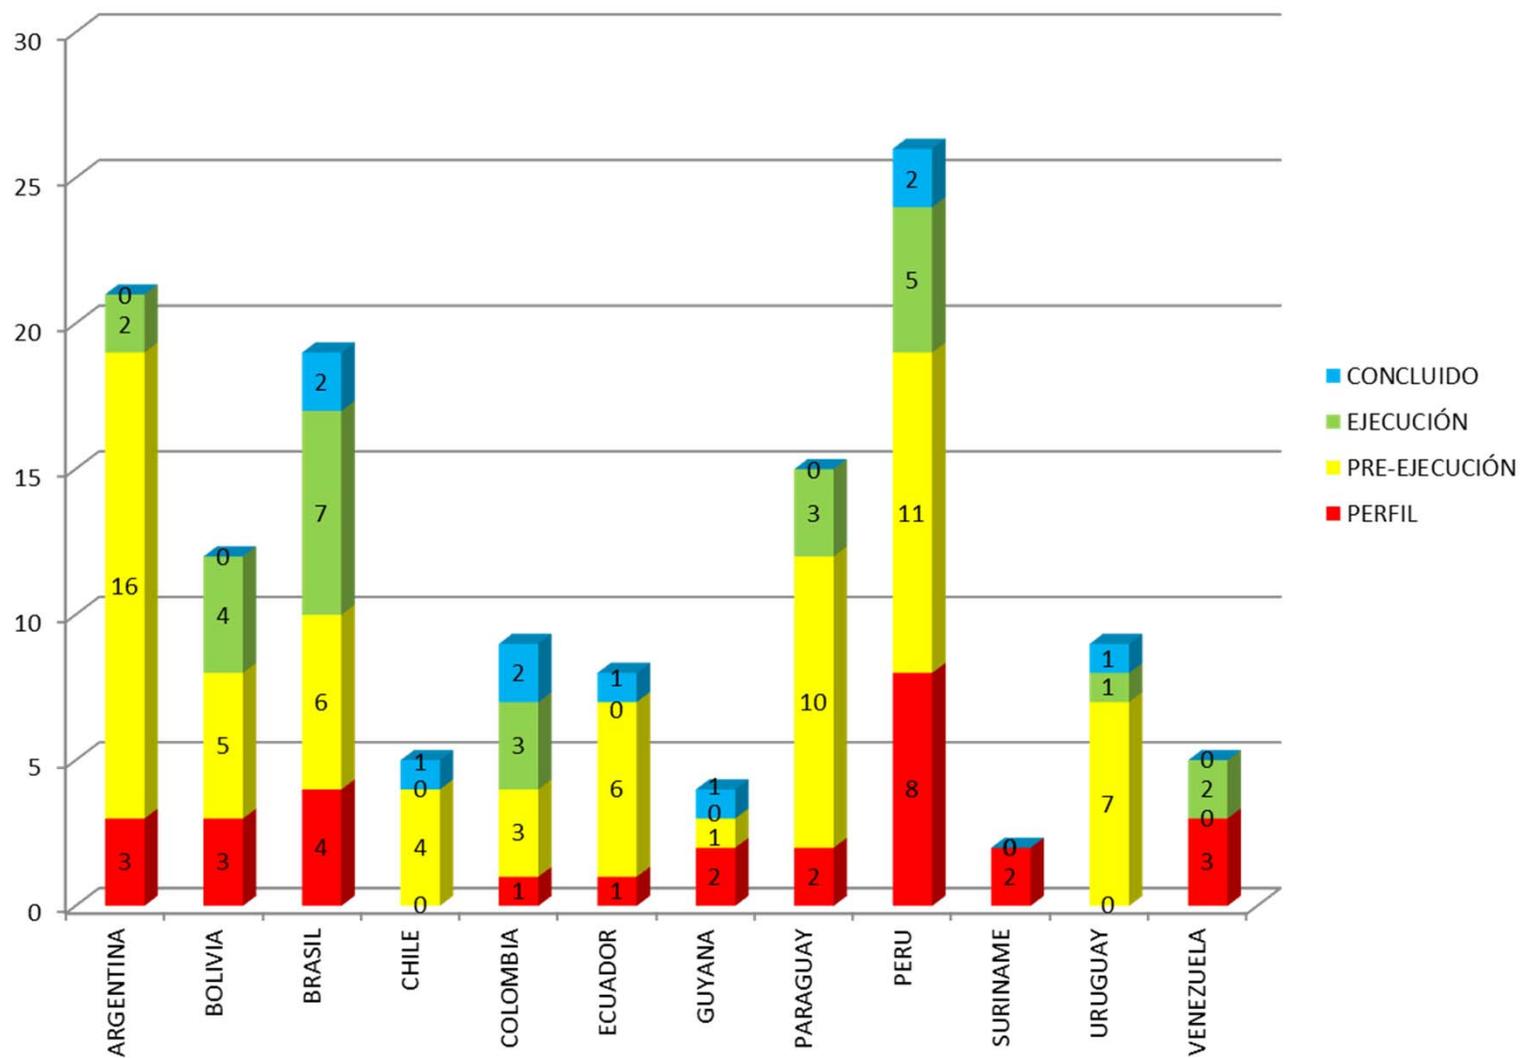

# INFORME DE AVANCE DE LA API 2013

## 6- PROYECTOS DE LA API SEGÚN ETAPAS Y SUB ETAPAS DEL CICLO DE VIDA

ETAPAS Y SUB-ETAPAS DE LOS PROYECTOS											
	PRE-EJECUCIÓN						EJECUCIÓN				CONCLUIDO
PERFIL 25,6%	48,8%						20,7%				4,9%
(21)	(40)						(17)				(4)
Condición inicial	Financiamiento para estudios aprobado	Estudios concluidos	Estudios aprobados	Permisos otorgados	Financiamiento para obras aprobado	Primer cuarto de obra	Segundo cuarto de obra	Tercer cuarto de obra	Cuarto cuarto obra	Obras recibidas	
% y N° proyectos (con programación) <sup>(2)</sup>	100,0%	32,5%	10,0%	12,5%	17,5%	7,5%	53,0%	17,6%	17,6%	0,0%	100,0%
	(21)	(13)	(4)	(5)	(7)	(3)	(9)	(3)	(3)	(0)	(4)
% y N° proyectos (sin programación) <sup>(3)</sup>	0,0%	20,0%				11,8%				0,0%	
	(0)	(8)				(2)				(0)	

(1) Los números de proyectos indicados y sus respectivos porcentajes están basados sobre el universo de los 82 proyectos comparables.

(2) Los valores señalados representan el porcentaje y número de proyectos en cada una de las etapas/sub-etapas de aquellos proyectos que cuentan con la programación del ciclo de vida completa. El 100% está basado en el total de proyectos de la etapa.

# INFORME DE AVANCE DE LA API 2013

## 7- ESTIMACIÓN DE CONCLUSIÓN DE LOS PROYECTOS INDIVIDUALES DE LA API (En número de proyectos y en porcentajes por año)

Año previsto de finalización	Nº Proyectos	% Proyectos
Concluidos	7	6,9
2013	3	3,0
2014	6	5,9
2015	14	13,8
2016	15	14,8
2017	13	12,9
2018	13	12,9
2019	3	3,0
2020	4	4,0
2021	1	1,0
2022	2	2,0
2024	1	1,0
2026	1	1,0
2040	1	1,0
Sin información disponible	17	16,8
<b>TOTAL</b>	<b>101</b>	<b>100,0</b>


80% DE LOS  
PROYECTOS ESTARÁN  
CONCLUIDOS AL  
FINALIZAR LA API

3% DE LOS  
PROYECTOS SE  
FINALIZARÁN  
DESPUÉS DE 2022

17% DE LOS  
PROYECTOS NO  
CUENTAN CON  
INFORMACIÓN EN EL  
SMP

# INFORME DE AVANCE DE LA API 2013

## 7- ESTIMACIÓN DE CONCLUSIÓN DE LOS PROYECTOS INDIVIDUALES DE LA API (En número de proyectos)

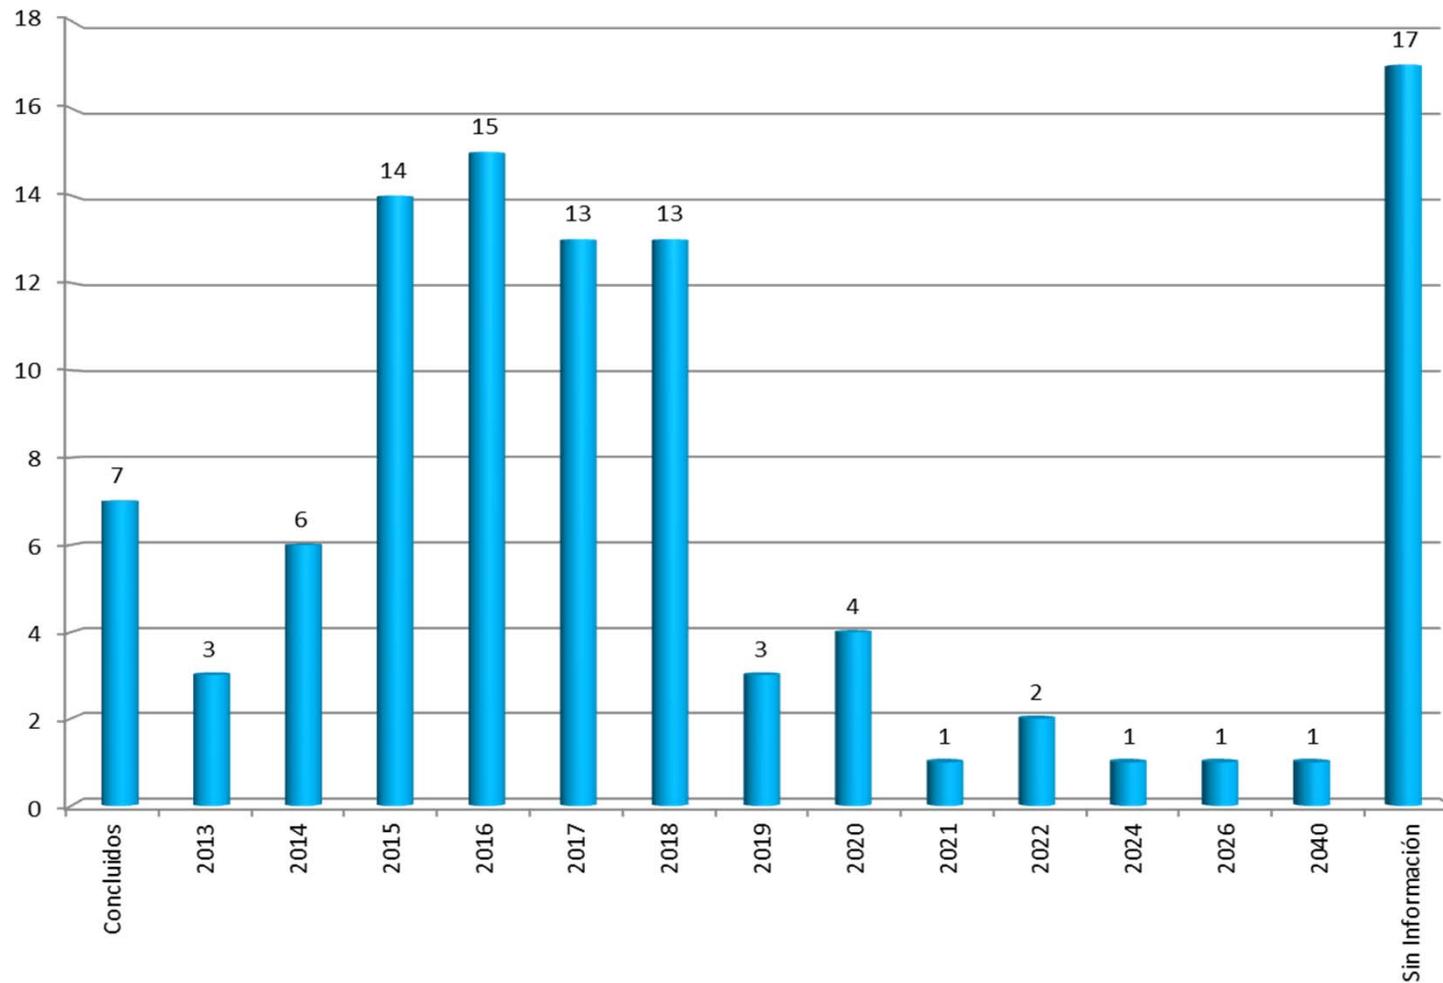

# ANÁLISIS DE INDICADORES DE AVANCE

- ¿Los reportes e indicadores que produce el SIP y el SMP son suficientes para mostrar el avance de los proyectos de la API por país, por proyectos estructurado y de la Agenda en general?
- ¿Qué otros elementos deberían incluirse para medir el avance de la API?

# ACCESO PÚBLICO/ ACCESO RESTRINGIDO

El módulo SMP actualmente es de acceso restringido:

- **Proyectos Individuales:** Programación, progreso y desvíos del Ciclo de Vida.
- **Proyectos Estructurados:** Etapa actual y avance en el último período (6 meses)

¿Es de utilidad hacer pública esta información a fin de hacer públicos los reportes e indicadores que se construyen a partir de la misma?

# LÁMINAS DE APOYO

# REPORTES E INDICADORES DE LA API PRODUCIDOS POR EL SIP Y EL SMP

- A. Reportes con información de acceso público
- B. Reportes con información de acceso restringido
- C. Indicadores del proyecto estructurado (de acceso restringido)

# A. REPORTE CON INFORMACIÓN DE ACCESO PÚBLICO

1. Proyectos estructurados de la API (nombre de los proyectos estructurados, países, monto de inversión estimada y N° de proyectos individuales)
2. Proyectos estructurados de la API por Eje de Integración y Desarrollo (EID) (EID, N° de proyectos estructurados, monto de inversión estimada, N° de proyectos individuales)
3. Proyectos estructurados de la API por país (País; N° de proyectos estructurados, N° de proyectos individuales)
4. Proyectos individuales de la API por Etapa del Ciclo de Vida (Etapa, N° de proyectos individuales; % N° de proyectos individuales, Monto de Inversión estimada y % Monto de Inversión estimada)

## B. REPORTES CON INFORMACIÓN DE ACCESO RESTRINGIDO

1. Proyectos estructurados de la API por Etapa del Ciclo de Vida y avances (agregado)
2. Proyectos estructurados de la API por Etapa del Ciclo de Vida y avances (gráfico)
3. Proyectos estructurados de la API por Etapa del Ciclo de Vida y avances (desagregado)
4. Estimación de conclusión de los proyectos estructurados de la API por año (Años, N° de proyectos estructurados, % N° de proyectos estructurados, Monto de Inversión estimada, % Monto de Inv. estimada)
5. Estimación de conclusión de los proyectos individuales de la API por año (Años, N° de proyectos individuales, % N° de proyectos individuales, Monto de Inversión estimada, % Monto de Inv. estimada)

## B. REPORTE DE ACCESO RESTRINGIDO (cont.)

6. Estimación de etapa del Ciclo de Vida de los proyectos individuales de la API por año (Años/Etapa , N° de Proy. Ind. de la API, % N° Proy., Monto de Inv. Estimada , %Monto de Inv. Est., Proy. Ind.)
7. Proyectos individuales de la API por Tipo de Financiamiento (Tipo de financiamiento, N° de Proyectos individuales de la API, % N° de Proyectos individuales de la API, Monto de inversión estimada)
8. Porcentaje de avance de cada proyecto individual y monto de inversión estimado.
9. Porcentaje de avance en el último periodo de cada proyecto individual y monto de inversión estimado.

# C. INDICADORES DEL PROYECTO ESTRUCTURADO (DE ACCESO RESTRINGIDO)

## 1. Etapa actual del Proyectos Estructurado

- Promedio simple
- Promedio Ponderado
- Amplitud de brecha

## 2. Avance en el último período (6 meses)

- Promedio simple
- Promedio Ponderado
- Amplitud de brecha

# INFORME DE AVANCE DE LA API 2013

Incluye reportes para el conjunto de los proyectos que componen la API basados en información pública:

- Evolución de los proyectos de la API 2012-2013 (en N° de proyectos y millones de US\$) (pág. 24)
- Evolución de los proyectos de la API por EID 2012-2013 (en N° de proyectos, millones de US\$ y en %) (pág. 25)
- Alcance territorial de los proyectos estructurados de la API (en % del N° de proyectos) (pág. 26)
- Distribución de los proyectos estructurados de la API por país (en N° de proyectos) (pág. 27)
- Composición sub sectorial de la API (en % del N° de proyectos) (pág. 28)
- Composición sub sectorial de la API (en % del monto de inversión) (pág. 28)
- Composición sub-sectorial de la API por EID (en N° de proyectos y millones de US\$) (pág. 29)

(cont.)

- Tipo de financiamiento de los proyectos individuales de la API (en % del N° de proyectos y de inversión estimada) (pág. 31)
- Tipo de financiamiento de la API por EID (en N° de proyectos) (pág. 31)
- Tipo de financiamiento de la API por EID (en millones de US\$) (pág. 32)
- Tipo de financiamiento de la API por sector (en % del monto de inversión estimada) (pág. 32)
- Situación de los proyectos de la API 2013 según etapas del ciclo de vida (en N° de proyectos, millones de US\$ y en %) (pág. 33)
- Proyectos de la API según el ciclo de vida (en N° de proyectos) (pág. 34)
- Proyectos de la API según etapa del ciclo de vida por EID (en N° de proyectos) (pág. 35)
- Evolución de los proyectos de la API entre 2012 y 2013 según etapas del ciclo de vida (en N° de proyectos) (pág. 35)
- Evolución de los proyectos de la API entre 2012 y 2013 según etapas del ciclo de vida por EID (en N° de proyectos) (pág. 36)

# INFORME DE AVANCE DE LA API 2013

Incluye reportes para el conjunto de los proyectos que componen la API basados en información del SMP:

- Proyectos de la API según etapas y sub etapas del ciclo de vida (en % y N° de proyectos) (pág.38)
- Estimación de conclusión de los proyectos individuales de la API (en N° de proyectos y en % por año) (pág.40)
