

Agenda de Implementación Consensuada 2005-2010

Informe de estado de situación de los 31 proyectos en 2009



XIV Reunión de Coordinadores Nacionales - 25 y 26 de agosto de 2009, Buenos Aires





Objetivo

Presentar de manera general el Estado de avance de los proyectos que integran la Agenda de Implementación Consensuada (AIC), tomando como base la información disponible en el Sistema de Información para la Gestión Estratégica (SIGE).

Recuperación de la navegabilidad por el Río Meta

Carretera Pasto-Mocoa

Puerto Francisco de Orellana

Carretera Paita-Tarapoto-Yurimaguas, puertos y centros logísticos

Carretera Lima-Tingo María-Pucallpa, puertos y centros logísticos

Puente sobre el Río Acre

Pavimentación Iñapari-Puerto Maldonado-Inambari, Inambari-Juliaca/Inambari-Cusco

Centro de frontera de Desaguadero

Carretera Toledo-Pisiga

Rehabilitación de la carretera Iquique-Colchane

Construcción del puente binacional Salvador Mazza-Yacuiba

Gasoducto del Noreste Argentino

Ruta internacional 60 CH (sector Valparaíso-Los Andes)

Proyecto ferroviario Los Andes-Mendoza

Adecuación del corredor Río Branco-Montevideo-Colonia Nueva Palmira



Paso de frontera Cúcuta-San Antonio del Táchira

Mejorías en la vía New Nickerie-Paramaribo-Albina y cruce internacional sobre el Río Marowijne

Carretera Venezuela (Ciudad Guayana)-Guyana (Georgetown)-Surinam (Paramaribo) (1° etapa)

Carretera Boa Vista-Bonfim-Lethem-Georgetown (1° etapa: estudios)

Puente sobre el Río Takutu

Rehabilitación del tramo El Sillar

Construcción de la carretera Pailón-San José-Puerto Suárez

Construcción de la carretera Cañada Oruro-Villamontes-Tarija-Estación Abaroa (1° etapa)

Anillo ferroviario de São Paulo (Norte y Sur)

Paso de frontera Infante Rivarola-Cañada Oruro

Nuevo puente Presidente Franco-Porto Meira y centro de frontera

Duplicación del tramo Palhoça-Osorio (Rodovia Mercosur)

Duplicación de la ruta 14

Construcción del puente internacional Jaguarão-Río Branco

Exportación por envíos postales para PYMES

Implementación de acuerdo de roaming en América del Sur



Estado de Situación de la AIC-SIGE

- En muchos de los proyectos se mostraron avances en la superación de Etapas Críticas y en la gestión de Restricciones.

-  Etapas Críticas identificadas que fueron superadas dentro del plazo previsto.
-  Etapas Críticas que se desarrollan dentro del plazo previsto para su superación
-  Etapas Críticas que se desarrollan, pero a las que se necesita mayor atención por parte de los gerentes de proyecto.
-  Etapas Críticas que no fueron superadas conforme lo planificado.
- R** **Restricción:** Asunto que traba el avance de una Etapa Crítica y acciona su gestión para continuar con el avance del proyecto

Proyecto	Actualizado	R	Situación (SIGE)
Carretera Lima-Tingo María-Pucallpa, Puertos y Centros Logísticos	16/4/2009		
Carretera Paita-Tarapoto-Yurimaguas, Puertos y Centros Logísticos	16/4/2009		
Carretera Pasto-Mocoa	04/5/2009	R	
Puerto Francisco de Orellana	03/5/2009		
Centro de Frontera de Desaguadero	04/8/2009		
Paso de Frontera Cúcuta-San Antonio del Táchira	16/4/2009	R	
Recuperación de la navegabilidad por el Río Meta	16/4/2009	R	
Construcción del Puente Binacional Salvador Mazza-Yacuiba	27/4/2009		
Nuevo Puente Presidente Franco-Porto Meira y Centro de Frontera	20/4/2009		
Carretera Boa Vista-Bonfim-Lethem-Georgetown (1° etapa: estudios)	28/5/2008		
Carretera Venezuela (Ciudad Guayana)-Guyana (Georgetown)-Surinam (Paramaribo) (1° etapa)	13/5/2009		
Mejorías en la vía New Nickerie-Paramaribo-Albina y Cruce Internacional sobre el Río Marowijne	13/5/2009		
Puente sobre el Río Takutu	29/4/2009		Concluido 7/08
Anillo Ferroviario de São Paulo (Norte y Sur)	21/5/2009	R	
Carretera Toledo-Pisiga	21/4/2009		
Construcción de la Carretera Cañada Oruro-Villamontes-Tarija-Estación Abaroa (1° etapa)	14/5/2009		

Proyecto	Actualizado	R	Situación (SIGE)
Construcción de la Carretera Pailón-San José-Puerto Suárez	13/5/2009		
Paso de Frontera Infante Rivarola-Cañada Oruro	16/4/2009		
Rehabilitación de la Carretera Iquique-Colchane	27/4/2009		
Rehabilitación del Tramo El Sillar	21/4/2009		
Adecuación del Corredor Rio Branco-Montevideo-Colonia -Nueva Palmira	20/4/2009		
Construcción del Puente Internacional Jaguarão-Rio Branco	29/4/2009		
Duplicación de la Ruta 14 entre Paso de los Libres y Gualeguaychú	27/4/2009		
Duplicación del Tramo Palhoça-Osorio (Rodovia Mercosur)	21/4/2009		
Gasoducto del Noreste Argentino	30/4/2009		
Proyecto Ferroviario Los Andes-Mendoza	20/4/2009		
Ruta Internacional 60 CH (sector Valparaíso-Los Andes)	16/4/2009		
Pavimentación Iñapari-Puerto Maldonado-Inambari, Inambari-Juliaca/Inambari-Cusco	15/4/2009		
Puente sobre el Río Acre	15/4/2009		<u>Concluido 1/06</u>
Implementación de Acuerdo de Roaming en América del Sur	05/4/2009		
Exportación por Envíos Postales para PYMES	18/8/2009		



Estado general de los Proyectos


- La proyección de la implementación de la AIC para 2010 refleja un nivel importante de avance.
- 24 Proyectos se encuentran es estado de avance alto o medio.
- 2 Proyectos se encuentran concluidos..
- 5 Proyectos se presentan con postergaciones de diferentes carácter.
 - Solo dos proyectos presentan Restricciones no superadas.



Estado de los 31 Proyectos

- Ejecución: 19
- Preparación: 10
 - *Con Restricciones no superadas: 2*
 - *Con Restricciones superadas: 2*
- Concluidos: 2

■ Ejecución ■ Preparación ■ Concluidos

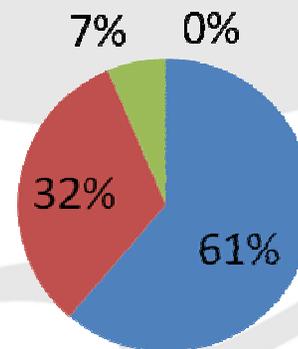

N°	PROYECTOS	EJE/PROCESO	MILLONES DE US\$	PAÍSES
1	Duplicación de la Ruta 14	MERCOSUR-Chile	780,00	AR (BR)
2	Adecuación del Corredor Rio Branco-Montevideo-Colonia-Nueva Palmira	MERCOSUR-Chile	247,50	UY (AR-BR)
3	Construcción del Puente Internacional Jaguarão-Rio Branco	MERCOSUR-Chile	35,00	BR-UY
4	Duplicación del Tramo Palhoça-Osorio (Rodovia Mercosur)	MERCOSUR-Chile	989,00	BR (AR-UY)
5	Proyecto Ferroviario Los Andes-Mendoza	MERCOSUR-Chile	3.000,00	AR-CH
6	Ruta Internacional 60 CH (sector Valparaíso-Los Andes)	MERCOSUR-Chile	280,00	CH (AR)
7	Gasoducto del Noreste Argentino	MERCOSUR-Chile	1.000,00	AR (BO)
8	Construcción del Puente Binacional Salvador Mazza-Yacuiba	Capricornio	10,00	AR-BO
9	Nuevo Puente Presidente Franco-Porto Meira y Centro de Frontera	Capricornio	60,00	PY-BR
10	Construcción de la Carretera Pailón-San José-Puerto Suárez	Interoceánico Central	417,00	BO (BR-CH-PE)
11	Anillo Ferroviario de São Paulo (Norte y Sur)	Interoceánico Central	400,00	BR
12	Paso de Frontera Infante Rivarola-Cañada Oruro	Interoceánico Central	1,70	BO-PY
13	Construcción de la Carretera Cañada Oruro-Villamontes-Tarija-Estación Abaroa (1° Etapa)	Interoceánico Central	60,00	BO (PY)
14	Carretera Toledo-Pisiga	Interoceánico Central	93,00	BO (CH)
15	Rehabilitación de la Carretera Iquique-Colchane	Interoceánico Central	52,00	CH (BO)
16	Rehabilitación del Tramo El Sillar	Interoceánico Central	120,00	BO (CH-PE)
Subtotal			7.545,20	

N°	PROYECTOS	EJE/PROCESO	MILLONES DE US\$	PAÍSES
17	Centro Binacional de Atención en Frontera Desaguadero	Andino	7,50	BO-PE
18	Paso de Frontera Cúcuta-San Antonio del Táchira	Andino	2,00	CO-VE
19	Recuperación de la Navegabilidad por el Río Meta	Andino	108,00	CO-VE
20	Carretera Pasto-Mocoa	Amazonas	332,00	CO
21	Carretera Paita-Tarapoto-Yurimaguas, Puertos y Centros Logísticos	Amazonas	338,00	PE (BR)
22	Carretera Lima-Tingo María-Pucallpa, Puertos y Centros Logísticos	Amazonas	542,80	PE (BR)
23	Puerto Francisco de Orellana	Amazonas	314,20	EC
24	Pavimentación Iñapari-Puerto Maldonado-Inambari, Inambari-Juliaca/Inambari-Cusco	Perú-Brasil-Bolivia	1053,00	PE (BR)
25	Puente sobre el Río Acre	Perú-Brasil-Bolivia	12,00	BR-PE
26	Carretera Boa Vista-Bonfim-Lethem-Georgetown (1° Etapa: Estudios)	Escudo Guayanés	3,30	GY-BR
27	Puente sobre el Río Takutu	Escudo Guayanés	10,00	GY-BR
28	Carretera Venezuela (Ciudad Guayana)-Guyana (Georgetown)-Suriname (Paramaribo) (1° Etapa)	Escudo Guayanés	0,80	VE-GY-SU
29	Mejorías en la Vía Nieuw Nickerie-Paramaribo-Albina y Cruce Internacional sobre el Río Marowijne	Escudo Guayanés	105,00	SU-GY
30	Exportación por Envíos Postales para PyMEs	TICs	2,50	Regional
31	Implementación de Acuerdo de <i>Roaming</i> en América del Sur	TICs	0,40	Regional
Subtotal			2.830,70	
TOTAL			10.375,90	

 En Ejecución


 En Preparación

 Concluidos



AIC - 31 Proyectos

Referencia: Montos total de inversión estimada en US\$ millones

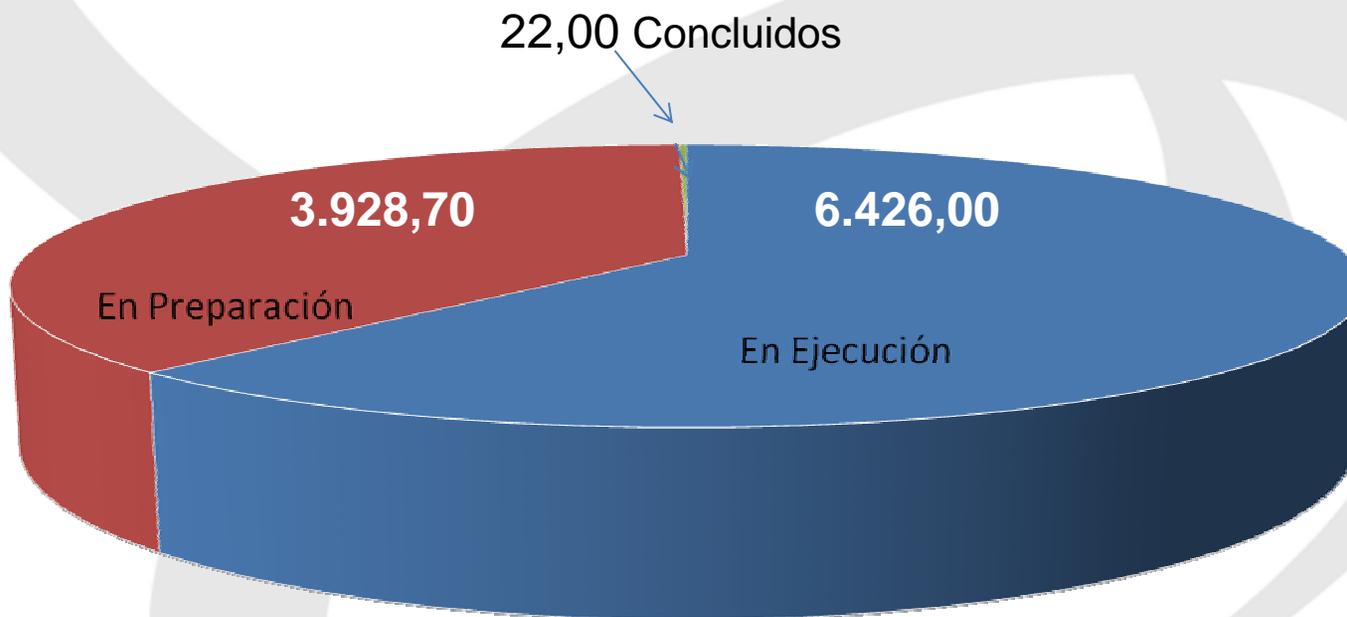



AIC – Naturaleza del Financiamiento por estado de situación

Ejecución : 19

Público: 10

Privado: 0

P/P: 8

Concesión: 1

Preparación: 10

Público: 5

Privado: 1

P/P: 4

Concesión: 0


Concluidos: 2

Público: 2

Privado: 0

P/P: 0

Concesión: 0

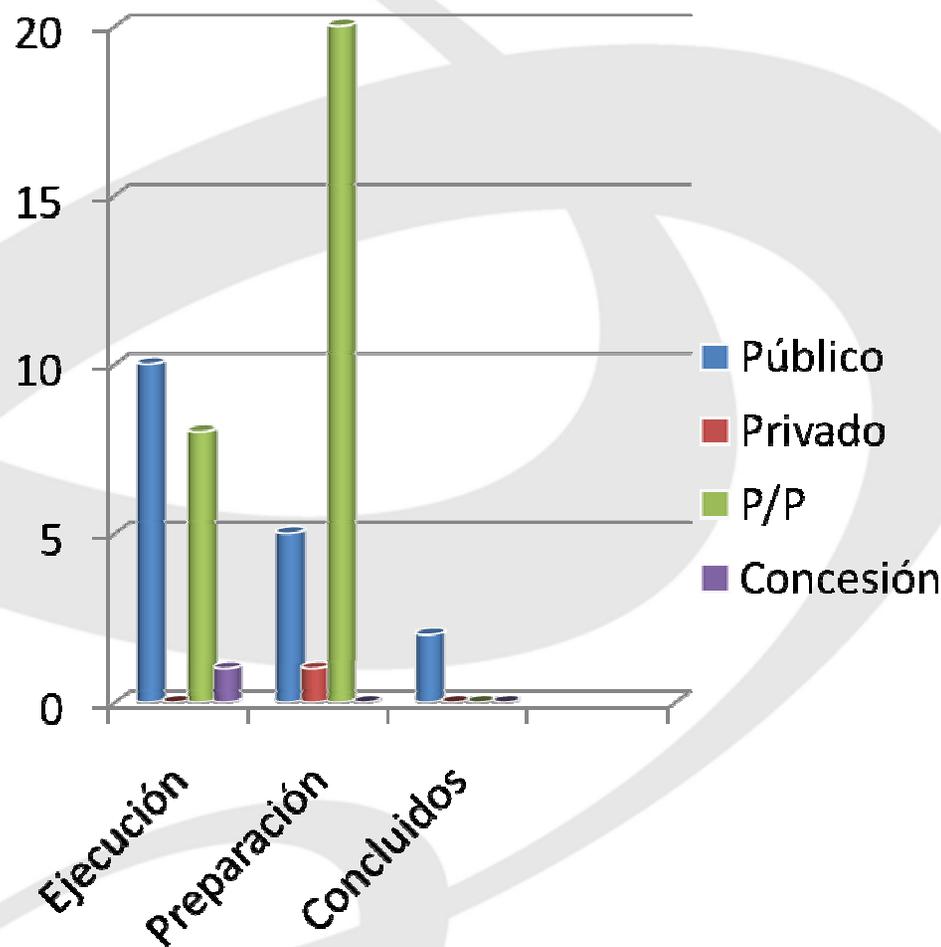



Montos de financiamiento por estado de situación en (US\$ millones)

Ejecución :



19 proyectos

Público: 1.888,3

Privado: 0

P/P: 4.257,7

Concesión: 280,0

Preparación:



10 proyectos

Público: 74,5

Privado: 3.000

P/P: 854,2

Concesión: 0

Concluidos:



2 proyectos

Público: 22,0

Privado: 0

P/P: 0

Concesión: 0



Muchas gracias
