



Indicadores de Resultados de la Cartera de Proyectos del COSIPLAN

Reunión del GTE de los EIDs para la
Actualización de la Cartera de Proyectos y de la API
22 – 24 de abril de 2014, Bogotá, Colombia

OBJETIVO DE LA SESIÓN

- Analizar indicadores para evaluar los resultados de los proyectos del COSIPLAN y comunicar los logros obtenidos en la implementación de los mismos y en el avance de la agenda de integración de América del Sur.

ANTECEDENTES

- PAE
 - Acción 4.2 Actualizar la Cartera de Proyectos de Infraestructura del COSIPLAN.
- Plan de Trabajo 2014 COSIPLAN-IIRSA
 - Continuar actualizando y mejorando la calidad de la información de los proyectos, incorporando descriptores específicos para los distintos sectores y sub-sectores y tipos y modalidades de financiamiento.

RESULTADOS ESPERADOS DE LA SESIÓN

- Acordar los campos de información necesarios para elaborar indicadores que permitan medir el cumplimiento de los objetivos de los proyectos.
- Acordar un cronograma para su implementación en el SIP y para la carga de información.

COMUNICANDO LOS LOGROS ALCANZADOS POR LOS PROYECTOS CONCLUIDOS

- Actualmente el SIP no cuenta con información específica sobre los resultados de los proyectos concluidos.
- Algunas fichas incluyen información de resultados en los campos “situación” y “comentarios”, otras no incluyen nada.
- La descripción incompleta de los proyectos a la entrada, impide valorar los logros alcanzados a la salida.

EJEMPLO DE PROYECTO BINACIONAL CONCLUIDO

SITUACIÓN PAÍS 1:

(...) el proyecto estuvo a cargo de la Cia. Constructora “XYZ”, por un monto de **26.310.068** y tiene un avance de obra del 100% y que fue concluido el **16 de enero del 2009**. La contraparte nacional para este proyecto en lo que corresponde al país alcanzó a **11.548.322 Euros**.

SITUACIÓN PAÍS 2:

El componente del País 2 de las obras del proyecto comprende el financiamiento de: (i) El Nuevo Puente Internacional ABC (80 m.), (ii) 8.8 Km. de la Variante Internacional, que tiene una longitud total de 11.6 Km. y (iii) un Centro Binacional de Atención de Frontera. La variante internacional fue concluida en **junio de 2009** con una inversión de **US\$ 44,64 millones**. El Puente Internacional concluyó en **octubre de 2009**, con una inversión de **US\$ 6,67 millones**.

COMENTARIO:

El proyecto ha sido financiado por la **Comunidad Europea con US\$ 69.115.838**, a través de una donación otorgada a País 1 y País 2, en el marco del Plan Binacional de Integración Fronteriza. El **País 1 aporta US\$ 19.733.153**. Dicho proyecto **ha permitido realizar obras viales binacionales entre País 1 y País 2**, priorizadas y definidas por los estudios relativos al Eje Vial N° 1, a fin de **reducir la vulnerabilidad de la infraestructura a los fenómenos naturales y de mejorar el tránsito transfronterizo**. En el total de la inversión no se considera las inversiones de los centros de frontera de País 1 y País 2, ya que forman parte de otro proyecto del mismo Eje.

LA PROPUESTA SE BASA EN:

- Análisis de los campos existentes de las fichas de los proyectos en función de las dimensiones internacionalmente aceptadas de la gestión de proyectos (Alcance, Costo y Financiamiento, y Plazos).
- Consideración de la propuesta de descriptores específicos por sub-sector y tipo de obra.
- Propuesta de un conjunto de campos de información específicos para los proyectos concluidos.

ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN DE LAS FICHAS DE PROYECTOS EN EL SIP DE COSIPLAN		
Dimensiones del Proyecto	Campos de información	Tipo de información
Alcance	MÓDULO IDENTIFICACIÓN	
	Nombre	Descriptiva
	Código	Eje + Número de proyecto
	Eje	Andino, de Capricornio, de la Hidrovía Paraguay-Paraná, del Amazonas, del Escudo Guayanés, del Sur, Interoceánico Central, Mercosur-Chile, Perú-Brasil-Bolivia
	Grupo	Número y nombre del Grupo de Proyectos
	Países	Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, Paraguay, Perú, Suriname, Uruguay, Venezuela
	Ámbito	Nacional, Binacional, Trinacional o más
	MÓDULO CARACTERIZACIÓN	
	Sector	Comunicaciones, Energía, Transporte
	Sub-sector	Según Sector seleccionado
	Tipo de obra	Según Sub-sector seleccionado
	Implementación por tramo	Sí, No
	API	Sí, No
	ANCLA	Sí, No
	Proyecto Estructurado API	Al elegir API Sí se incorpora el nombre del Estructurado
	MÓDULO DESCRIPCIÓN	
	Objetivo	Descriptiva
	Descripción del Proyecto (Actualmente Solución)	Descriptiva
	Descriptores por Tipo de Obra	
	Situación por País	Descriptiva
	Situación conjunta	Descriptiva
	Comentario	Descriptiva
	Riesgos potenciales o amenazas	

ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN DE LAS FICHAS DE PROYECTOS EN EL SIP DE COSIPLAN

Dimensiones del Proyecto	Campos de información	Tipo de información
Costos/Monto de inversión	MÓDULO FINANCIAMIENTO	
	Tipo de financiamiento	Público, Privado, Público/Privado
	Fuente de financiamiento	A definir, Bancos Privados, BID Público, BID Privado, Binacional, BNDES, CAF, FOCEM, FONPLATA, Gobierno de Italia, Grupo Banco Mundial, JBIC, PNUD, Privados/Corporativo, Tesoro Municipal, Tesoro Nacional, Tesoro Provincial, Unión Europea, Varios
	Inversión por fuente	en US\$
	Inversión Total	en US\$
	Estado de financiamiento	No iniciado, En trámite, Aprobado, En desembolso, Completado
	MÓDULO ESTUDIOS Y LICENCIAS	
	Licencia ambiental	Sí, No
	Estudio/s completos	Sí, No
	Estado de los estudios	No Iniciado, Iniciado
	Monto de los estudios	en US\$
	Fuente de financiamiento de los estudios	A definir, Bancos Privados, BID Público, BID Privado, Binacional, BNDES, CAF, FOCEM, FONPLATA, Gobierno de Italia, Grupo Banco Mundial, JBIC, PNUD, Privados/Corporativo, Tesoro Municipal, Tesoro Nacional, Tesoro Provincial, Unión Europea, Varios

ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN DE LAS FICHAS DE PROYECTOS EN EL SIP DE COSIPLAN

Dimensiones del Proyecto	Campos de información	Tipo de información
Plazos	Todos los proyectos de la Cartera	
	Etapa de proyecto	Perfil, Pre-Ejecución, Ejecución, Concluido
	Etapa del tramo (si aplica)	Perfil, Pre-Ejecución, Ejecución, Concluido
	Proyectos de la API con SMP	
	Recursos estudios	Fecha de término de Sub-Etapa de Pre-Ejecución
	Estudios en desarrollo	Fecha de término de Sub-Etapa de Pre-Ejecución
	Estudios aprobados	Fecha de término de Sub-Etapa de Pre-Ejecución
	Permisos otorgados	Fecha de término de Sub-Etapa de Pre-Ejecución
	Recursos Obras	Fecha de término de Sub-Etapa de Pre-Ejecución
	Cuartos de obra	Fecha de término de Sub-Etapa de Ejecución
Programación, progreso y desvíos	Información de seguimiento sobre el cumplimiento de la programación y de los riesgos materializados que la afectan	

DOCUMENTANDO LOS LOGROS DE LOS PROYECTOS

DIMENSIÓN ALCANCE

- Proyectos en implementación
 - Adoptando descriptores por tipo de obra para medir el avance (Etapas Pre-Ejecución y Ejecución).
- Proyectos concluidos
 - Adoptando descriptores por tipo de obra para registrar y comunicar los resultados de las inversiones.

DOCUMENTANDO LOS LOGROS DE LOS PROYECTOS

DIMENSIÓN COSTOS Y FINANCIAMIENTO (US\$)

- **Proyectos en implementación**
 - Monto de inversión por fuente de financiamiento
 - Monto de inversión total
 - Módulo Estudios y Licencias
- **Proyectos concluidos**
 - Monto de inversión final del proyecto
 - Costo total de los estudios

DOCUMENTANDO LOS LOGROS DE LOS PROYECTOS

DIMENSIÓN PLAZOS

- **Proyectos en implementación**
 - Fecha de inicio y fin de cada etapa y sub-etapa (proyectos con SMP)
- **Proyectos concluidos**
 - Fecha de inicio de la obra
 - Fecha de entrega de la obra

PROPUESTA DE CAMPOS DE INFORMACIÓN PARA PROYECTOS CONCLUIDOS

Dimensiones del Proyecto	Campos de información	Tipo de información
ALCANCE	Descriptores por tipo de obra	Información específica producto de la implementación del proyecto
COSTOS Y FINANCIAMIENTO	Monto de inversión final del proyecto	en US\$
	Costo total de los estudios	en US\$
PLAZOS	Fecha de inicio de la obra	DD/MM/AAAA
	Fecha de entrega de la obra	DD/MM/AAAA

MEJORANDO LA CALIDAD DE LA INFORMACIÓN:


Cronograma de Implementación y Responsables

- Campos para proyectos concluidos acordados por los países
 - Fecha: 16 de mayo
- Implementación informática
 - **Responsable:** Secretaría del CCT
 - Fecha de implementación: **Junio de 2014**
- Cronograma para la carga de información
 - **Responsable:** Países
 - **2014.** Proyectos API y Proyectos Ancla (18 de agosto)
 - **2015.** Resto de la Cartera

CRONOGRAMA PROPUESTO 2014


Proyectos API y Proyectos Ancla Concluidos

País	Proyectos Ancla Concluidos	Proyectos API concluidos	Total proyectos
ARGENTINA	4	0	4
BRASIL	1	2	3
CHILE	2	1	3
COLOMBIA	0	2	2
ECUADOR	1	1	2
GUYANA	0	1	1
PARAGUAY	1	0	1
PERU	3	2	5
URUGUAY	0	1	1
TOTAL	12	10	22

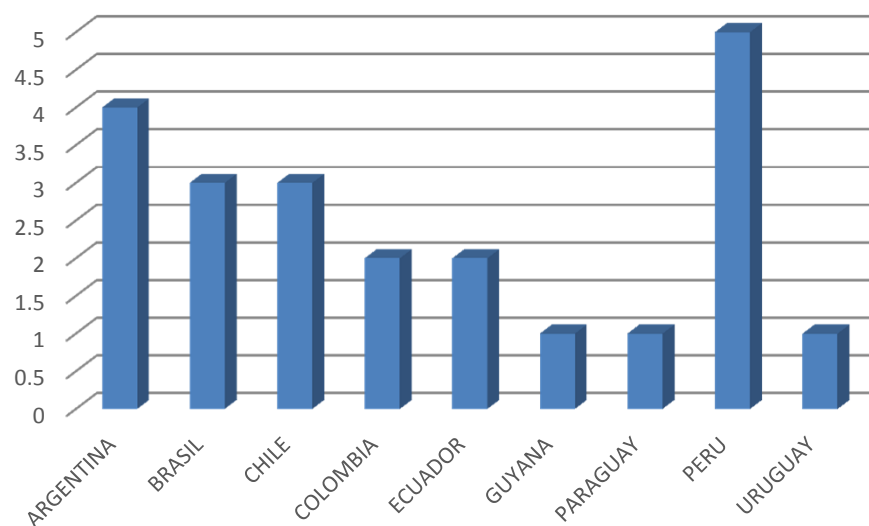

CRONOGRAMA PROPUESTO 2015

Resto de los Proyectos Concluidos de la Cartera*

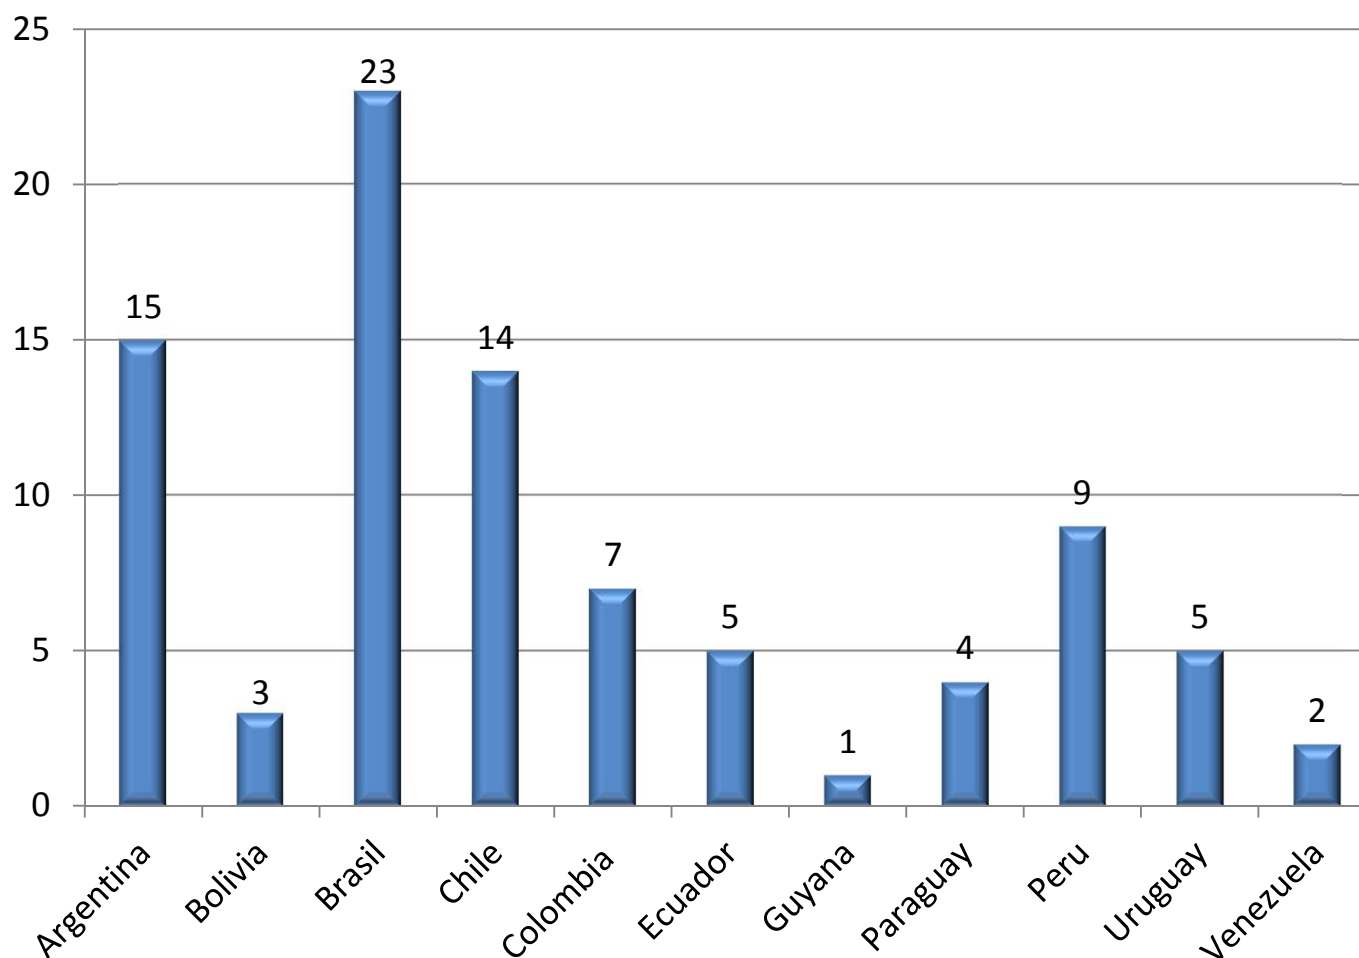

* Proyectos concluidos a la fecha. Se deberán considerar también aquellos proyectos que se concluyan en 2014 y 2015

PROYECTOS CONCLUIDOS POR EJE

Total 95

